SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 10/03/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: **BOULEVARD ROSENDO G.CASTRO 7 No.1753 OTE. COL. EL REALITO,LOS MOCHIS,AHOME,**	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. **CJE-070329-CF6**	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**25204**	No. DE OBRA:	**250673**	C.C.T.	**25EPR0281D**	ESTIMACIÓN:	**01 NORMAL**
PLANTEL:	**PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA**			LOCALIDAD:	**EL FUERTE**	MUNICIPIO:	**EL FUERTE**
DESCRIPCIÓN:	**SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,489,018.64**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$521,156.52**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,489,018.64**

OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 6.00 MTS. EN ESTRUCTURA	
CONSTRUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 6.00 MTS	
INSTALACION ELECTRICA	$ 858,967.71
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$ 858,967.71**

SUB TOTAL=	**$ 858,967.71**
I.V.A AL 16 %	**$ 137,434.83**
TOTAL =	**$ 996,402.54**

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD ROSENDO G.CASTRO 7 No.1753 OTE. COL. EL REALITO,LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
R.F.C. CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250673	C.C.T.	25EPR0281D			ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
PLANTEL:	PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA				LOCALIDAD:	EL FUERTE	MUNICIPIO:	EL FUERTE	
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,489,018.64
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$521,156.52
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,489,018.64

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. CCT: 25EPR0281D										
	REHABILITACION ELECTRICA									
DST.TRANSF	DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	15014.25	$15,014.25	1.00	0.00		1.00	$15,014.25
TRNSF-150	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA TRIFASICO EN 33000/220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	186616.24	$186,616.24	1.00	0.00		1.00	$186,616.24
83127	REVISION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: CHECAR CORTO CIRCUITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	1.00	5138.42	$5,138.42	1.00	0.00		1.00	$5,138.42
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	18580.41	$18,580.41	1.00	0.00		1.00	$18,580.41
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	18865.68	$18,865.68	2.00	0.00		2.00	$37,731.36
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	135.00	1621.70	$218,929.50	105.00	0.00		105.00	$170,278.50
DSINT.LUM	DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	130.00	395.53	$51,418.90	100.00	0.00		100.00	$39,553.00
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	130.00	2438.03	$316,943.90	100.00	0.00		100.00	$243,803.00
REFLE.100W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA DE 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	2929.69	$14,648.45	5.00	0.00		5.00	$14,648.45
ELEC.HMEL60	SUMINSTRO Y COLOCACION DE GABINETE 80X60X30 CM NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	6935.78	$6,935.78	1.00	0.00		1.00	$6,935.78
INT.D3X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, CON GABINETE INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, GABINETE P/INT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	30062.08	$30,062.08	1.00	0.00		1.00	$30,062.08
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	15578.18	$77,890.90	3.00	0.00		3.00	$46,734.54
INT.D3X150	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	17595.28	$35,190.56	1.00	0.00		1.00	$17,595.28
ALERPEL	LEYANDA ALERTA PELIGRO ALTO VOLTAJE	PZA	6.00	546.91	$3,281.46	4.00	0.00		4.00	$2,187.64
51041	SUMINSTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA ELECTRICA, SENSOR DE LUZ.	PZA	5.00	747.64	$3,738.20	4.00	0.00		4.00	$2,990.56

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD ROSENDO G.CASTRO 7 No.1753 OTE. COL. EL REALITO,LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
R.F.C. CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250673	C.C.T.	25EPR0281D			ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
PLANTEL:	PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA					LOCALIDAD:	EL FUERTE	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,489,018.64
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$521,156.52
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,489,018.64

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM. INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	5274.55	$26,372.75	4.00	0.00		4.00	$21,098.20
							TOTAL INSTALACION ELECTRICA			$858,967.71
									SUBTOTAL ESTIMACION	$858,967.71

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor

N= Contrato:
ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PGO: 25204
N-Obra: 250673

Subestacion de 150 kva de pedestal con Media y Baja Tension en primaria prof. Jose Remeria, Ubicada en el Fuerte, Municipio de el Fuerte, Estado de Sinaloa.

Importe de Obra: $ 1489018.64.

BITÁCORA

CCT: 25EPR0281D

Fecha inicio trabajos: 10 de Febrero 2026
Fecha termino trabajos: 10 de Abril 2026

Empresa:
Construcciones Jear S.A. de C.V.
RFC: CJE-070329-CF6

Telef:
687-367-98-03

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Remanentes del Fondo de Aportaciones Multiples 2025 Nivel Basica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Prof. Jose Reyeria.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPR0281D

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: El Fuerte

MUNICIPIO: El Fuerte

TIPO DE OBRA:

☐

☐

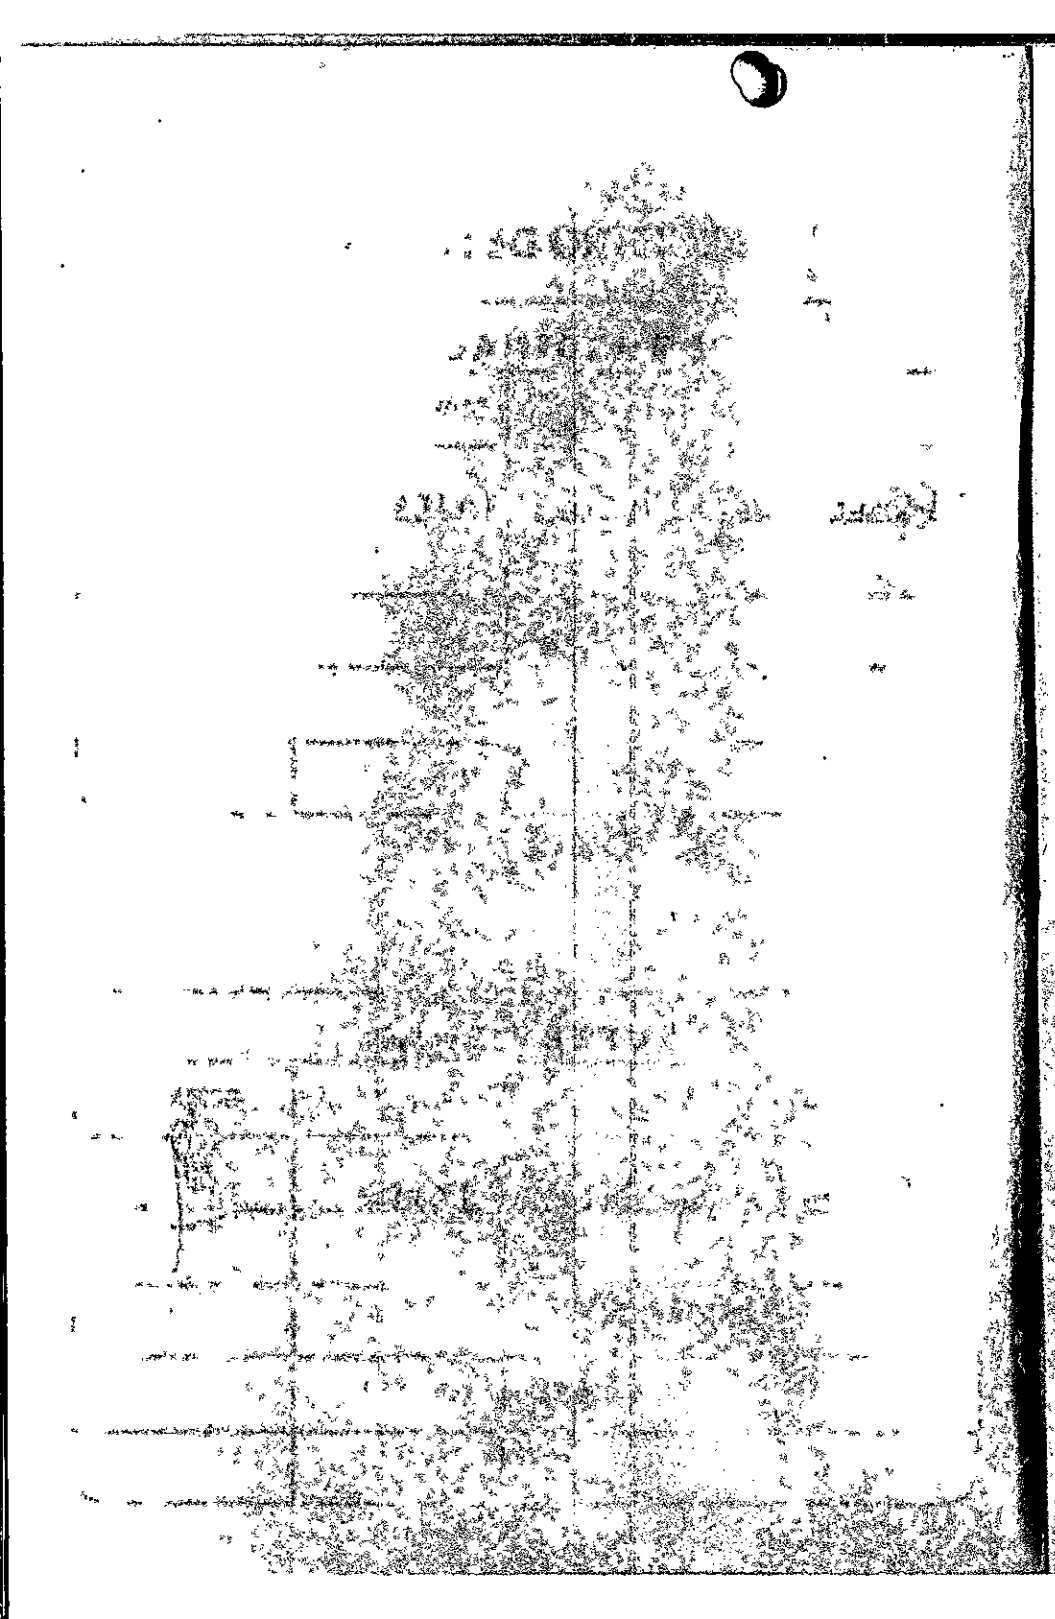

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250673 No. 001

FECHA 10-FEBRERO 2026

EN ESTA FECHA SE DIO VISITA AL PLANTEL EN CONJUNTO, COORDINADOR, SUPERVISOR ISIPE Y EMPRESA CONTRATADA AL PLANTEL PARA DEFINIR TRABAJO A EJECUTAR EN BASE A CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS PARA BENEFICIO DEL PLANTEL BENEFICIADO, CON NUMERO DE CONTRATO ISIPE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 002

FECHA 11 AL 21 FEBRERO 2026

En base a Visita de Obra se observaron los trabajos de Desinstalacion de Transformador Existente con lineas de Alimentacion a Interruptor principal, Asi como los trabajos de Suministro y Colocacion de Transformador tipo Pedestal de 150 KVA Trifasico en 33000/220-127 V.

Se Realizaron los trabajos de Revision General de Instalacion Electrica, El Suministro y Colocacion de Gabinetes 80x60x30 cm en Barra, Gabinete M5 y Gabinete M Incluye Trans. Suministro y Colocacion de Power Block, y los Interruptores Termomagneticos.

3x 400 Amp.

3x 125 Amp.

3x 150 Amp.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250623 No. 003

FECHA DEL 23 AL 28 FEBRERO 2026

EN BASE A VISITA DE OBRA SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE CONCRETO PREFABRICADO DE BORDO CH, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA CON VARILLA COPPERWELD DE 1.0 MTS. EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPO DE CANCHA DE 30 CIRCUITOS, ASI COMO LOS TRABAJOS DE DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 004

FECHA AL 10 DE MARZO 2026

EN BASE A VISITA DE OBRA A PLANTEL SE OBSERVARON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO CON CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12 Y CAL 14 ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 2X17 W Y LUMINARIOS Y LUMINARIAS DE 100 W.

SE PROCEDIO CON REVISION DE ESTIMACION No 1 EN CONJUNTO COORDINADOR SUPERVISOR DE OBRA ISIFE Y EMPRESA CONTRATANA, CORROBORANDO QUE CONCEPTOS Y VOLUMENES QUE SE PRETENDE COBRAR ESTAN EJECUTADOS AL 100% EN PLANTEL BENEFICIADO CON NUMERO DE CONTRATO:

ISIFE-R-FAM-ADE-EPRE-008-2026
