SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 03/03/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: **SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199**	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. LSE-180202-UH7	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**25204**	No. DE OBRA:	**250674**	C.C.T.	**25DPR1008E**	ESTIMACIÓN:	**01**
PLANTEL:	**PRIMARIA AGUSTIN MELGAR**			LOCALIDAD:	**CULIACAN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,861,667.12**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,861,667.12**

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	**$ 802,541.38**

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$ 802,541.38**
SUB TOTAL=	**$ 802,541.38**
I.V.A AL 16 %	**$ 128,406.62**
TOTAL =	**$ 930,948.00**

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 03/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250674	C.C.T.	25DPR1008E			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,861,667.12
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,861,667.12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	SUBESTACION DE 112.50 KVA CON RED DE MEDIA Y BAJA TENSION									
	REHABILITACION ELECTRICA									
	ELECTRIFICACION									
DST.TRANSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: GRUA ARTICULADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$9,117.16	$8,964.36	1.00	0.00	0.00	1.00	$9,117.16
TRNSF-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA EN 13200 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$171,780.96	$170,736.86	1.00	0.00	0.00	1.00	$171,780.96
ACOMTR.MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. DE 2 1/2", TUBERIA CONDUIT GALV. DE 2 1/2", CODO DE PVC, TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADA DE 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$15,437.91	$15,270.90	2.00	0.00	0.00	2.00	$30,875.82
CAB.THW.CAL2/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	145.00	$393.74	$56,873.35	120.00	0.00	0.00	120.00	$47,248.80
CAB.THW.CAL2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	$220.51	$2,196.80	7.00	0.00	0.00	7.00	$1,543.57
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$25,116.95	$24,921.14	1.00	0.00	0.00	1.00	$25,116.95
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70 X 70 CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$16,055.75	$15,963.54	1.00	0.00	0.00	1.00	$16,055.75
INT.D3X300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$26,350.63	$26,225.40	1.00	0.00	0.00	1.00	$26,350.63
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$9,317.54	$9,259.79	4.00	0.00	0.00	4.00	$37,270.16
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$16,237.01	$16,150.82	1.00	0.00	0.00	1.00	$16,237.01
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$3,535.37	$3,501.97	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,535.37
TERM.TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PARA CONEXION A BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$1,573.81	$1,544.59	1.00	0.00	0.00	1.00	$1,573.81

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 03/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250674	C.C.T.	25DPR1008E			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	**$1,861,667.12**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,861,667.12**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
DEM.NICHOMED	DEMOLICION DE NICHO DE MEDICION; INCLUYE: RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	*PZA*	*1.00*	*$2,351.24*	*$2,310.34*	*1.00*	*0.00*	*0.00*	*1.00*	*$2,351.24*
ADBARDA	ADECUACION EN BARDA PARA FIJACION DE GABINETE DE MEDICION; INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, RESANES, RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$3,090.05	$3,049.15	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,090.05
	ALIMENTADORES A CENTROS DE CARGA								0.00	
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	56.00	$369.40	$20,332.48	42.80	0.00	0.00	42.80	$15,810.32
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.40	$400.65	$3,310.44	10.15	0.00	0.00	10.15	$4,066.60
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.00	$258.84	$22,857.30	88.70	0.00	0.00	88.70	$22,959.11
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00	$333.28	$45,724.00	137.70	0.00	0.00	137.70	$45,892.66
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.00	$24.01	$2,126.70	88.70	0.00	0.00	88.70	$2,129.69
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.00	$183.97	$16,257.60	88.70	0.00	0.00	88.70	$16,318.14
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.26	$5,057.24	$6,345.41	1.52	0.00	0.00	1.52	$7,687.00
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$15,720.29	$31,307.00	***2.00***	0.00	0.00	2.00	$31,440.58
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$12,072.03	$24,043.86	2.00	0.00	0.00	2.00	$24,144.06
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	178.00	$311.83	$55,210.26	176.70	0.00	0.00	176.70	$55,100.36
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$1,965.97	$9,746.40	5.00	0.00	0.00	5.00	$9,829.85

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 03/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250674	C.C.T.	25DPR1008E			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	***$1,861,667.12***
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,861,667.12**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE *CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE:* REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$5,620.56	$11,187.32	2.00	0.00	0.00	2.00	$11,241.12
ELEC.099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLEGADA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 2", RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$1,600.05	$6,300.00	4.00	0.00	0.00	4.00	$6,400.20
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$1,737.52	$6,840.08	5.00	0.00	0.00	5.00	$8,687.60
	LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS									
DSINT.CC	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE CENTROS DE CARGA OBSOLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	$1,001.22	$8,785.62	9.00	0.00	0.00	9.00	$9,010.98
DSINT.ABAN	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE ABANICO DE TECHO EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	$543.86	$12,726.00	24.00	0.00	0.00	24.00	$13,052.64
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	87.00	$1,307.74	$112,465.77	66.00	0.00	0.00	66.00	$86,310.84
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	66.00	$2,687.49	$190,817.88	15.00	0.00	0.00	15.00	$40,312.35
										$802,541.38
										$802,541.38
									TOTAL	**$802,541.38**

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ARQ. KIREY UBREA TANIYAMA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

"SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA."

BITÁCORA

LER SOLUCIONES DEL EVORA SA DE CV.
PGO: 250204
No. OBRA: 250674

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REMANENTE FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA AGUSTIN MELGAR

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR1009E

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: JUAN RUIZ DE ALARCON COL. EMILIANO ZAPATA

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACAN

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arq. Karen Urrea Tanimana	ISIFE	
L.C. Edgar Montoya Monroy	Contratista	

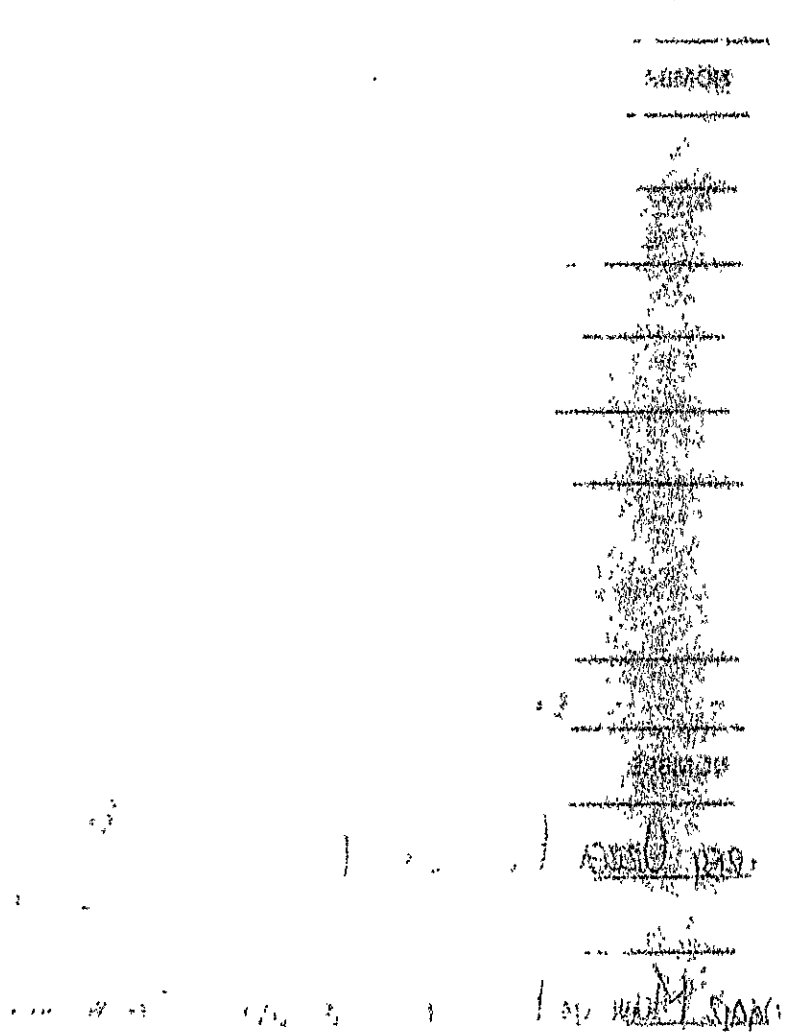

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 001

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026

Con esta Fecha se abre el Presente libro de bitacora Para dar Inicio a los trabajos de obra: "Subestación 112.5 kva con media y baja tensión en Primaria Agustin Melgar, ubicada en Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa"

PGO: 25204

No. DE OBRA: 250674

No. DE CONTRATO: ISIFE-B-FAM-ADG-EPR-009-2026

MONTO DE LA OBRA: $1,861,667.12 CON I.V.A.

CLAVE DEL PLANTEL: 25DPR1008E

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 10 DE MAYO DE 2026

OFICIO DE AUTORIZACION Y FECHA: SAF-AGF-0044/2025

Con Fecha del 13 de Mayo de 2025.

A Continuación Firman los Supervisión de ISIFE y la Parte Contratista.

ARQ KIREY URREA TANIYAMA
SUPERVISORA DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA M.
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 002

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2026

Con esta fecha se realizo una visita al plantel para Revisar los Avances de obra y se pudo observar que el contratista ya tiene desistalado el transformador para hacer las adecuaciónes para colocar la nueva subestación, continuando con los trabajos de suministro y colocación de bajada desde el transformador hacia los interruptores principales, de igual manera se encuentra realizado la demolición de nicho existente de interruptores principales, y adecuaciones de banda para colocación de gabinete M-10 y M-5, estos gabinetes tambien ya se encuentran colocados. Se pudo observar que se encuentra instalado el interruptor principal de 3x300Amp y los interruptores para derivar de 3x100 Amp. y el Power brock de distribución aun sin cablear.

una vez terminado el recorrido firman por una parte la Supervisión de isite y la Parte contratista.

ARQ KAREY UAREA TANIYAMA
SUPERVISORA DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA M.
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 003

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026

Con esta fecha se volvio a realizar un recorrido por Parte de ISIFE y Parte del Contratista y se pueden observar avances en la subestación, como son el suministro e instalación de cable de cobre thhw calibre 2/0 y cal. 2, para bajadas desde el transformador a interruptor General, tambien ya se encuentra colocada la nueva subestación de 112.5 kva en 13200v tipo Poste. El contratista continuo durante este tiempo con la cimentación para los centros de carga, y se comenzo con el corte con disco en concreto, demolición de concreto a base de equipo neumatico, y siguio con la excavación de terreno tipo "B" para zanja, tambien ya se encuentran colocados los registros de 40x40 y 60x60 para hacer la distribución electrica del Plantel. Los trabajos de Colocación de Poliducto de alta densidad de 2 0 3 Pulgadas, colocación de cinta señalizadora de Peligro y el relleno y compactación del terreno ya se encuentran realizados.

una vez terminado el recorrido firman por una Parte la Supervisión de ISIFE y la Parte Contratista.

ARQ. KARLY VARELA TANIYAMA

ING. EDGAR MONTOYA M.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 004

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026

Con esta fecha se realiza una visita al plantel Para revisar los Avances de obra, y el contratista termino los trabajos de reposición de concreto en las áreas que se demolio, tambien se encuentran realizados los llegados a los centros de carga desde los registros. Se instalaron los centros de carga de 30 circuitos y de 20 circuitos para las aulas reaveridas, Continuando el recorrido se puede observar tambien la instalación del cable para la alimentación electrica de centros de carga 3f1 cal. 110 y conductor desnudo cal. 8. Ademas de la colocación de barra de cobre y terminales para neutros y tierras fisicas en los gabinetes ya instalados, una vez terminando el recorrido el contratista continuo con la colocación de los sistemas de tierra fisica en registros. una vez terminado el recorrido firman por una parte la supervisión de Isite y la parte contratista.

ARQ. RUBEY URREA TANIYAMA
SUPERVISORA DE ISIFE

LIC. EDGAR MONTOYA M.
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 005

FECHA 03 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realizo una visita al plantel para seguir con la supervisión y el contratista continua con la desconexión y desinstalación de Centros de carga obsoletos, tambien con el retiro de abanicos de techo en mal estado, se puede observar que tambien se encuentran realizadas las salidas de alumbrado conexión para luminarias en las Aulas de diversas areas del plantel. Tambien ya se encuentran instalados una parte de las luminarias de 2x17w, una vez terminado el recorrido el contratista hace entrega de los generadores de la estimación 01 normal para su revisión y aprovación con los siguientes datos.

Importe de la Estimación: $ 930,948.00

Amortización de Anticipo: NO APLICA

3% De Inspeccion de Obra: $ 24,076.24

Importe neto a recibir: $ 906,871.76

una vez terminado el recorrido firman la Supervisión de isite y la parte contratista para la continuación de trabajos restantes.

ARQ. KLAGY MAREA TANIYAMA

LIC. EDGAR MONTOYA M.
