SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 26/03/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. LSE-180202-UH7	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**25204**	No. DE OBRA:	**250674**	C.C.T.	**25DPR1008E**	ESTIMACIÓN:	**02 FINIQUITO**
PLANTEL:	**PRIMARIA AGUSTIN MELGAR**			LOCALIDAD:	**CULIACAN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$1,861,667.12**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,861,667.12**

OBRA		IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	**$**	**733,737.34**
EXTRAORDINARIOS	**$**	**69,581.52**

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**803,318.86**			
			POR CIERRES DE OBRA SOLO DE COBRARA:		
SUB TOTAL=	**$**	**803,318.86**	*SUB TOTAL=*	*$*	*802,344.07*
I.V.A AL 16 %	**$**	**128,531.02**	*I.V.A AL 16 %*	*$*	*128,375.05*
TOTAL =	**$**	**931,849.88**	*TOTAL =*	*$*	*930,719.12*

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 26/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250674	C.C.T.	25DPR1008E			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,861,667.12
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,861,667.12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	SUBESTACION DE 112.50 KVA CON RED DE MEDIA Y BAJA TENSION									
	REHABILITACION ELECTRICA									
	ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO									
ELEC.SA.AA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 2 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	390.00	$1,121.53	$432,455.40	327.55	0.00	0.00	327.55	$367,357.15
ELEC.DESC2X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO DESCONECTADOR 2 POLOS 60 AMPS A 240 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	31.00	$1,935.16	$59,472.57	31.00	0.00	0.00	31.00	$59,989.96
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	31.00	$949.18	$29,210.99	31.00	0.00	0.00	31.00	$29,424.58
	LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS								0.00	$0.00
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES), INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	41.00	$1,240.99	$50,332.83	17.00	0.00	0.00	17.00	$21,096.83
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$1,610.46	$38,290.56	41.00	0.00	17.00	41.00	$66,028.86
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	66.00	$2,687.49	$190,817.88	61.00	15.00	0.00	61.00	$163,936.89
CONT.DPX	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	41.00	$305.83	$12,402.09	41.00	0.00	0.00	41.00	$12,539.03
APAG.SENC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR COMPLETO	PZA	24.00	$319.08	$7,578.00	17.00	0.00	0.00	17.00	$5,424.36

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 26/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250674	C.C.T.	25DPR1008E			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,861,667.12
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,861,667.12

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	$467.04	$9,220.40	17.00	0.00	0.00	17.00	$7,939.68
										$733,737.34
0	EXTRAORDINARIOS									
EXTRA 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 13-20 PARA ALOJAR MEDICION MT	PZA	0.00	$18,654.63	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$18,654.63
EXTRA 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1" PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS INCLUYE: TUBERIA, COPLES, CONECTORES, CONDULET LB, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	$599.19	$0.00	52.20	0.00	0.00	52.20	$31,277.72
EXTRA 03	SUMINITRO E INSTALACION DE CABLE XLP AL 2+1 CAL 6 + 1 DESNUDO CAL 8 INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA INSTALACION.	ML	0.00	$179.06	$0.00	54.20	0.00	0.00	54.20	$9,705.05
EXTRA 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADOR EN N5 3X50 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	$7,307.70	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$7,307.70
EXTRA 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 2X50 A TIPO Q0 PARA ALIMENTAR CENTROS DE CARGA DE 8 CIRCUITOS	PZA	0.00	$1,318.21	$0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	$2,636.42
										$69,581.52
										$803,318.86
										$803,318.86
									TOTAL	**$803,318.86**

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

"SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA."

BITÁCORA

LER SOLUCIONES DEL EVORA SA DE CV.
PCO: 250204
NO. OBRA: 250674

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Remanente fondo de aportaciones múltiples 2025

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Agustín Melgar

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR1008E

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Juan Ruiz de Alarcón Col. Emiliano Zapata

LOCALIDAD: Culiacán, Rosales

MUNICIPIO: Culiacán

TIPO DE OBRA:

☐

☐

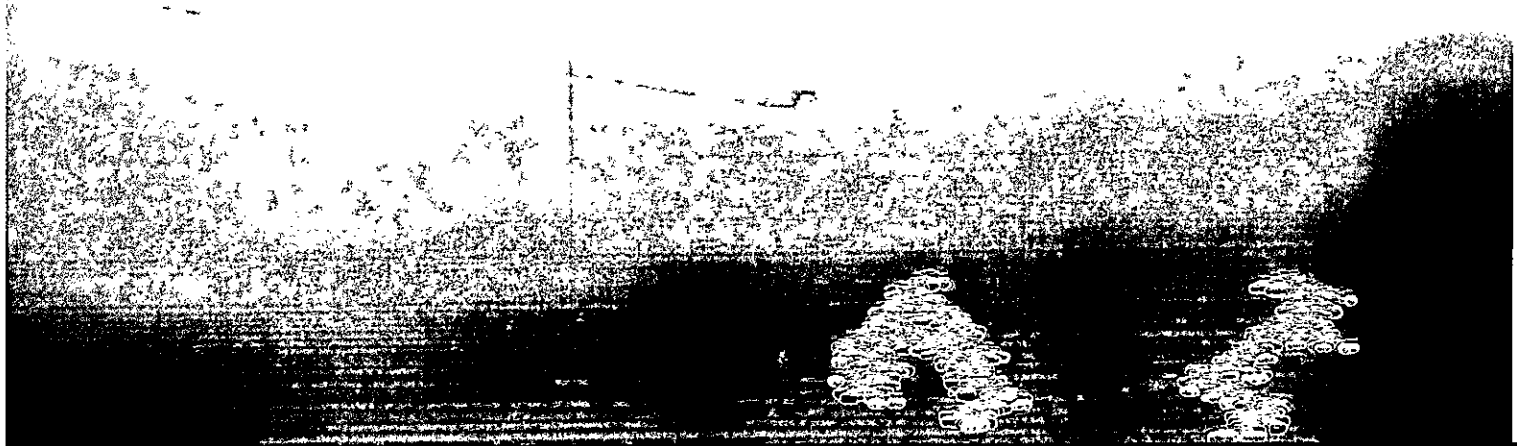

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. KAREN URIOSTEGUI TAMAYO	ISIFE	
LIC. EDGAR MONTOYA MONROY	COORDINADOR ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 001

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2026

Con esta Fecha se abre el Presente libro de bitacora Para dar Inicio a los trabajos de obra: "Subestación LIZ.S 100l con media y baja tensión en Primaria Agustin Melgar ubicada en Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, Estado de sinaloa"

PGO : 25204

No. DE OBRA: 250674

No. DE CONTRATO: ISIFE-B-FAM-ADG-EPA-009-2026

MONTO DE LA OBRA: $1,861,667.12 CON I.V.A.

CLAVE DEL PLANTEL: 25DPR1008E

FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 10 DE MAYO DE 2026

OFICIO DE AUTORIZACION Y FECHA: SAF-AGF-0044/2025

Con Fecha del 13 de Mayo de 2025.

A Continuación Firman los Supervisión de ISIFE y la Parte Contratista.

ARQ KIRGY UBREA TANIYAMA
SUPERVISORA DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA M.
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 002

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2026

Con esta fecha se realizo una visita al plantel para Revisar los Avances de obra y se pudo observar que el Contratista ya tiene desinstalado el transformador para hacer las adecuaciones para colocar la nueva Subestación, Continuando con los trabajos de Suministro y colocación de bajada desde el transformador hacia los Interruptores principales, de igual manera se encuentra realizado la demolición de nicho existente de interruptores Principales, y adecuaciones de banda para colocación de gabinete M-10 y M-5, estos gabinetes tambien ya se encuentran colocados. Se pudo observar que se encuentra instalado el interruptor principal de 3x800Amp y los interruptores para derivar de 3x100 Amp. y el Power block de distribución aun sin cablear.

una vez terminado el recorrido firman por una parte la Supervisión de isite y la Parte contratista.

ARQ LARRY UBALDO TANIYAMA
SUPERVISORA DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA M.
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 003

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026

Con esta fecha se volvio a realizar un recorrido por parte de ISIFE y parte del Contratista y se pueden observar avances en la subestación, como Son el Suministro e instalación de cable de cobre thw calibre 210 y cal. 2, para bajadas desde el transformador a interruptor General, tambien ya se encuentra Colocada la nueva Subestación de 112.5 kva en 13200v tipo Poste, El Contratista Continuo durante este tiempo Con la cimentación para los Centros de carga, y se Comenzo con el corte con disco en concreto, demolición de Concreto a base de equipo neumatico, y siguio Con la excavación de terreno tipo "B" para zanja, tambien ya se encuentran colocados los registros de 40x40 y 60x60 para hacer la distribución electrica del Plantel. Los trabajos de Colocación de Conduleto de alta densidad de 2 o 3 Pulgadas, Colocación de Cinta señalizadora de Peligro y el relleno y Compactación del terreno ya se encuentra realizados. una vez terminado el recorrido firman por una parte la Supervisión de ISIFE y la parte Contratista.

ANA KAREN VARELA TANIYAMA
SUPERVISORA DE ISIFE

LIC. GLORIA MONTOYA M.
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 005

FECHA 03 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realizo una visita al Plantel para seguir con la supervisión y el contratista continua con la desconexión y desinstalación de Centros de carga obsoletos, tambien con el retiro de abanicos de techo en mal estado, Se puede observar que tambien se encuentran realizadas las salidas de alumbrado conexión para luminarias en los Aulas de diversas areas del Plantel. Tambien ya se encuentran instalados una parte de las luminarias de 2x17w, una vez terminado el recorrido el Contratista hace entrega de los generadores de la estimación 01 normal para su revisión y aprovación con los siguientes datos.

Importe de la Estimación: $ 930,948.00

Amortización de Anticipo: NO APLICA

3% De Inspeccion de Obra: $ 24,076.24

Importe neto a recibir: $ 906,871.76

una vez terminado el recorrido firman la Supervisión de isite y la parte contratista para la continuación de trabajos restantes.

ARQ. KLAEY [illegible] TANIYAMA
SUPERVISORA DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA M.
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 006

FECHA 04 de marzo de 2026

Con esta fecha el contratista hace entrega de la solicitud para conceptos extraordinarios no considerados en el presupuesto original y los cuales son necesarios para cumplir con las necesidades y optimizar el funcionamiento del plantel a continuacion se enlista los conceptos a revision

CLAVE:	Concepto	Unidad	Volumen
EXTRA 01	Suministro e instalacion de base 13-20 para alojar medicion INT.	PZA	1.00
EXTRA 02	Suministro e instalacion de tuberia galvanizada de 1" para alimentar centro de carga de 8 circuitos	ML	52.20
EXTRA 03	Suministro e instalacion de alimentador Principal con cable XLP AL 2FT Cal. 6FT Desnudo Cal. 8	ML	54.20
EXTRA 04	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x50Amp	PZA	1.00
EXTRA 05	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 2x50Amp	PZA	2.00

Una vez entregada la solicitud quedamos a la espera de su revision y autorizacion para la ejecucion de los mismos.

Arq. Kirey Ulrea Tahiyana
Supervisora de obra

Lic. Edgar Montejo Montoya
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 007

FECHA 09 DE MARZO DE 2026

Con esta Fecha se realiza una Visita al Plantel Y el contratista ya tiene ejecutados los trabajos Para la alimentacion electricas de los equipos de aires acondicionados, asi como la colocacion de los interruptores tipo desconectador de 2 Polos de 60 amp a 240 volts. Siguiendo con el recorrido ya se encuentran instalados los interruptores termomagneticos de 2x20 Amp en los centros de carga Para cada una de los equipos de aire acondicionados.

Con esta Fecha tambien el contratista recibe la aprobacion Para la ejecucion de los conceptos extraordinarios solicitados, teniendo asi la autorizacion Para la ejecucion de los mismos.

A continuacion firman la supervision de ISIFED Y el contratista

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista

Ing. Karen Correa Tonivama
Supervisora de obra

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674 No. 008

FECHA 16 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realiza una visita al plantel para continuar con la supervision de los avances de la obra y pudimos observar que ya se encuentra realizados lo conceptos extraordinarios, ya se encuentra instalada la base de medicion 13-200M al igual que la tuberia de 1 pulgada para alimentar un centro de carga, tambien ya se encuentra instalado el cable XLP 2+1 calibre 6, continuando el recorrido tambien ya se coloco el interruptor termomagnetico de 3x50 Amp en Gabinete N5 para la derivacion de los circuitos del plantel, se puede observar tambien que ya se encuentran colocados los interruptores 2x50 Amp. Una vez terminado el recorrido el contratista continua con las trabajos electricos dentro de las aulas.

A continuacion firman la supervision de ISLFE y el contratista

Arq. Kirey Urrea Tamvama
supervisora de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674

No. 009

FECHA 23 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realiza una visita al Plantel para continuar con la revision de los avances de obra y el contratista ya tiene terminadas las salidas para conexion de apagadores y las salidas para conexion de contactos dentro de las aulas. de igual manera se encuentra realizando la colocacion de los apagadores y contactos duplex necesarios para el funcionamiento del Plantel, para despues continuar con la instalacion de las luminarias 2x17 watts en las diferentes areas solicitadas

A continuacion firman la supervision de ISLFIE y el contratista:

Arq. Karen Urrea Taniyama
Supervisora de Obra

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250674

No. 010

FECHA 26 de marzo de 2026

Con esta fecha se realiza un recorrido por el plantel, Se colocaron 2x17 watts en aulas y marquesinas. Se entregó la estimación 02 y finiquito para su revisión y aprobación con los siguientes datos:
Importe de la estimación: $930,719.12
Amortización del anticipo: —
Importe líquido a pagar: $906,648.80
Periodo de ejecución: 04-marzo-26 al 26-marzo-26
Una vez terminado el recorrido y revisada la información se da por concluidos los trabajos al 100% y cerrada la presente bitácora de obra.

Arq. Kirey Urrea
Supervisora de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 26-mar-26

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
DIRECCION: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DEO BRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250674

PLANTEL: PRIMARIA AGUSTIN MELGAR **LOCALIDAD:** CULIACAN ROSALES **MUNICIPIO:** CULIACAN

DESCRIPCIÓN: SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-feb-26 AL: 10-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 03-feb-26

IMPORTE DE OBRA:	$ 1,861,667.12	**CONVENIO ADICIONAL:**	CONV-ISIFE-IED-ADE-JN-270-2023		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ -	**PERÍODO CONVENIO ADICIC**	**DEL:**	**AL:**	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 1,861,667.12	**TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**	$0.00		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
-	**SUBESTACION DE 112.50 KVA CON RED DE MEDIA Y BAJA TENSION**												
-	**REHABILITACION ELECTRICA**												
-	**ELECTRIFICACION**												
DST.TRANSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: GRUA ARTICULADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 9,117.16	$ 8,964.36	1.00	$ 9,117.16	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 9,117.16
TRNSF-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA EN 13200 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$171,780.96	$ 170,736.86	1.00	$ 171,780.96	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 171,780.96
ACOMTR.MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. DE 2 1/2", TUBERIA CONDUIT GALV. DE 2 1/2", CODO DE PVC, TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADA DE 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 15,437.91	$ 15,270.90	1.00	$ 15,437.91	1.00	$ 15,437.91	0.00	$ -	2.00	$ 30,875.82
CAB.THW.CAL2/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	145.00	$ 393.74	$ 56,873.35	120.00	$ 47,248.80	0.00	$ -	0.00	$ -	120.00	$ 47,248.80
CAB.THW.CAL2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	$ 220.51	$ 2,196.80	7.00	$ 1,543.57	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 1,543.57
ELEC. M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 25,116.95	$ 24,921.14	1.00	$ 25,116.95	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 25,116.95
ELEC. M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70 X 70 CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 16,055.75	$ 15,963.54	1.00	$ 16,055.75	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 16,055.75

INT.D3 X300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 26,350.63	$ 26,225.40	1.00	$ 26,350.63	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 26,350.63
INT.D3 X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 9,317.54	$ 9,259.79	1.00	$ 9,317.54	3.00	$ 27,952.62	0.00	$ -	4.00	$ 37,270.16
INT.D3 X70	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$ 7,307.70	$ 22,569.48	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
PWE.B LOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 16,237.01	$ 16,150.82	1.00	$ 16,237.01	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 16,237.01
ELEC.0 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 3,535.37	$ 3,501.97	1.00	$ 3,535.37	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,535.37
TERM. TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PARA CONEXION A BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 1,573.81	$ 1,544.59	1.00	$ 1,573.81	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,573.81
DEM.NI CHOM ED	DEMOLICION DE NICHO DE MEDICION; INCLUYE: RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 2,351.24	$ 2,310.34	1.00	$ 2,351.24	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,351.24
ADBAR DA	ADECUACION EN BARDA PARA FIJACION DE GABINETE DE MEDICION; INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, RESANES, RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 3,090.05	$ 3,049.15	1.00	$ 3,090.05	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,090.05
	ALIMENTADORES A CENTROS DE CARGA						$ -		$ -				
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	56.00	$ 369.40	$ 20,332.48	42.80	$ 15,810.32	0.00	$ -	0.00	$ -	42.80	$ 15,810.32
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.40	$ 400.65	$ 3,310.44	8.40	$ 3,365.46	1.75	$ 701.14	0.00	$ -	10.15	$ 4,066.60
EXC.T P-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.00	$ 258.84	$ 22,857.30	88.70	$ 22,959.11	0.00	$ -	0.00	$ -	88.70	$ 22,959.11
ELEC. POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00	$ 333.28	$ 45,724.00	137.70	$ 45,892.66	0.00	$ -	0.00	$ -	137.70	$ 45,892.66
CINT.P RE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.00	$ 24.01	$ 2,126.70	88.70	$ 2,129.69	0.00	$ -	0.00	$ -	88.70	$ 2,129.69
RELL.E XC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	90.00	$ 183.97	$ 16,257.60	88.70	$ 16,318.14	0.00	$ -	0.00	$ -	88.70	$ 16,318.14
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.26	$ 5,057.24	$ 6,345.41	1.26	$ 6,372.12	0.26	$ 1,314.88	0.00	$ -	1.52	$ 7,687.00
ELEC. Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 15,720.29	$ 31,307.00	2.00	$ 31,440.58	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 31,440.58

ELEC. Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 12,072.03	$ 24,043.86	2.00	$ 24,144.06	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 24,144.06
ALIM.037	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	178.00	$ 311.83	$ 55,210.26	176.70	$ 55,100.36	0.00	$ -	0.00	$ -	176.70	$ 55,100.36
REG.P 40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$ 1,965.97	$ 9,746.40	5.00	$ 9,829.85	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 9,829.85
REG.P 60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 5,620.56	$ 11,187.32	2.00	$ 11,241.12	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 11,241.12
ELEC.099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLEGADA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 2", RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 1,600.05	$ 6,300.00	4.00	$ 6,400.20	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 6,400.20
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 1,737.52	$ 6,840.08	4.00	$ 6,950.08	1.00	$ 1,737.52	0.00	$ -	5.00	$ 8,687.60
	ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						$ -		$ -				
ELEC. SA.AA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 2 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	390.00	$ 1,121.53	$ 432,455.40	327.55	$ 367,357.15	0.00	$ -	0.00	$ -	327.55	$ 367,357.15
ELEC. DESC2 X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO DESCONECTADOR 2 POLOS 60 AMPS A 240 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	31.00	$ 1,935.16	$ 59,472.57	31.00	$ 59,989.96	0.00	$ -	0.00	$ -	31.00	$ 59,989.96
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	31.00	$ 949.18	$ 29,210.99	31.00	$ 29,424.58	0.00	$ -	0.00	$ -	31.00	$ 29,424.58
	LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS						$ -		$ -			0.00	$ -
DSINT. CC	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE CENTROS DE CARGA OBSOLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	$ 1,001.22	$ 8,785.62	9.00	$ 9,010.98	0.00	$ -	0.00	$ -	9.00	$ 9,010.98
DSINT. ABAN	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE ABANICO DE TECHO EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	$ 543.86	$ 12,726.00	24.00	$ 13,052.64	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 13,052.64
ELEC. SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	87.00	$ 1,307.74	$ 112,465.77	66.00	$ 86,310.84	0.00	$ -	0.00	$ -	66.00	$ 86,310.84
ELEC. SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES), INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	41.00	$ 1,240.99	$ 50,332.83	17.00	$ 21,096.83	0.00	$ -	0.00	$ -	17.00	$ 21,096.83

ELEC. SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE; CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	$ 1,610.46	$ 38,290.56	24.00	$ 38,651.04	17.00	$ 27,377.82	0.00	$ -	41.00	$ 66,028.86
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	66.00	$ 2,687.49	$ 190,817.88	66.00	$ 177,374.34	10.00	$ 26,874.90	0.00	$ -	76.00	$ 204,249.24
CONT. DPX	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX MODUS CON PLACA COLOR MARFIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	41.00	$ 305.83	$ 12,402.09	41.00	$ 12,539.03	0.00	$ -	0.00	$ -	41.00	$ 12,539.03
APAG. SENC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR COMPLETO	PZA	24.00	$ 319.08	$ 7,578.00	17.00	$ 5,424.36	0.00	$ -	0.00	$ -	17.00	$ 5,424.36
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	$ 467.04	$ 9,220.40	17.00	$ 7,939.68	0.00	$ -	0.00	$ -	17.00	$ 7,939.68
0	EXTRAORDINARIOS						$ -						
EXTRA 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 13-20 PARA ALOJAR MEDICION MT	PZA	0.00	$ 18,654.63	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 18,654.63	1.00	$ 18,654.63
EXTRA 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1" PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS INCLUYE: TUBERIA, COPLES, CONECTORES, CONDULET LB, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	$ 599.19	$ -	0.00	$ -		$ -	52.20	$ 31,277.72	52.20	$ 31,277.72
EXTRA 03	SUMINITRO E INSTALACION DE CABLE XLP AL 2+1 CAL 6 + 1 DESNUDO CAL 8 INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA INSTALACION.	ML	0.00	$ 179.06	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	54.20	$ 9,705.05	54.20	$ 9,705.05
EXTRA 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADOR EN N5 3X50 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	$ 7,307.70	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 7,307.70	1.00	$ 7,307.70
EXTRA 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 2X50 A TIPO Q0 PARA ALIMENTAR CENTROS DE CARGA DE 8 CIRCUITOS	PZA	0.00	$ 1,318.21	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,636.42	2.00	$ 2,636.42
					$1,604,885.45		**$1,434,881.92**		**$101,396.79**		**$ 69,581.52**		**$ 1,605,860.24**
					$1,604,885.45		**$1,434,881.92**		**$101,396.79**		**$ 69,581.52**		**$ 1,605,860.24**
		IVA 16%			**$ 256,781.67**		**$ 229,581.11**		**$ 16,223.49**		**$ 11,133.04**		**$ 256,937.64**
		TOTAL:			**$1,861,667.12**		**$1,664,463.03**		**$117,620.28**		**$ 80,714.56**		**$ 1,862,797.88**

POR CIERRE DE OBRA SOLO SE COBRARA

SUBTOTAL	***$ 1,604,885.45***
I.V.A.	***$ 256,781.67***
TOTAL	***$ 1,861,667.12***

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.				
PROGRAMA:	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	250674	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1008E		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026	MONTO:	$1,861,667.12		
CONTRATISTA:	LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$186,166.71
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de febrero de 2026	TÉRMINO:	10 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:	-	MONTO:	$0.00		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$1,861,667.12
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$1,861,667.12
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
10 de febrero de 2026	3 de marzo de 2026	01	$930,948.00
4 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026	02 FINIQUITO	$930,719.12
	TOTALES:	02	$1,861,667.12

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
ESCUELA PRIM. MAT. "AGUSTÍN MELGAR" CLAVE: 25DPR1008E CULIACÁN, SINALOA

PRIMARIA AGUSTIN MELGAR
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

M.C. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.				
PROGRAMA	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	250674	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1008E		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026	MONTO:	$1,861,667.12		
CONTRATISTA:	LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$186,166.71
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de febrero de 2026	TÉRMINO:	10 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$1,861,667.12
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$1,861,667.12
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
10 de febrero de 2026	3 de marzo de 2026	01	$930,948.00
4 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026	02 FINIQUITO	$930,719.12
TOTALES:		02	$1,861,667.12

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DESINALOA.		
PROGRAMA	REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	250674	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1008E
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026		MONTO:	$1,861,667.12	
CONTRATISTA:	LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$186,166.71
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de febrero de 2026		TÉRMINO:	10 de mayo de 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$1,861,667.12
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$1,861,667.12
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
10 de febrero de 2026	3 de marzo de 2026	01	$930,948.00
4 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026	02 FINIQUITO	$930,719.12
	TOTALES:	02	$1,861,667.12

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día **viernes 27 de marzo de 2026**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
25204	250674	$ 1,,861667.12	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA MA. RUBEN AGUIRRE ULLOA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

(250674). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización **No. SAF-AGF-0044/2025**, de fecha **13 de mayo de 2025**, con cargo al Programa **Remanentes del fondo de aportaciones múltiples 2025 nivel básica.**

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **03 de Febrero de 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista **LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.** representada por el **LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 1,,861667.12**,

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos fue de **90 días** naturales, con fecha de inicio el **10 de febrero de 2026** y conclusión el **10 de mayo de 2026.**

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **250674,** se llevó a cabo el día **26 de marzo de 2026**; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas **26 de marzo de 2026**, se llevó a cabo la elaboración de el finiquito correspondiente a la obra **250674**respectivamente.

E) La Póliza de Fianza **2630143-0000** emitida por **Liberty fianzas S.A. de C.V..,** además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250674	ANTICIPO	-	-	$ 0.00
250674	01	10 de febrero de 2026	03 de marzo de 2026	$ 930,948.00
250674	02 FINIQUITO	04 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026	$ 930,719.12
			TOTAL:	**$ 1,861,667.12**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las **14:00 catorce horas** del **viernes 27 de marzo de 2026**, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
Representante Legal de la Contratista
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-009-2026** de fecha **03 de febrero de 2026.**
