BITACORA DE OBRA FECHA / / 1

CONT-1212-2025

NOTA NO. 1 16/DIC/2025

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:
OPPU-EST-ADJ-FISE-IDAC-1212-2025

OBJETO DEL CONTRATO:
LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES DOS, EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, ENTRE CALLES LIC. VASCONCELOS Y MARIANO AZUELA, COLONIA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.
MONTO DEL CONTRATO: $ 1'709,680.25 INCL. IVA.
PLAZO DE EJECUCION: 16/DIC/2025 AL 31/DIC/2025.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DR-SUP-A-0513-2025, COMO RESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 16/ DIC/ 2025

LA SECRETARÍA PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-DI-0513-2025

NOTA NO. 3 16/DIC/ 2025

NOTIFICA AL CONTRATISTA, QUE CON ESTA FECHA DIERON INICIO LOS ~~TRABAJOS~~ LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 19/ DIC/ 2025

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS LAS TERRACERIAS DEL AREA DE LA CANCHA, Y DEL MURO DE CONTENCION. ASI COMO LA RESPECTIVA CIMENTACION, DE ACCESO AL PROYECTO.

NOTA NO. 5 22/ DIC/ 2025

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA LA CAPA DE BASE HIDRAULICA, CON SU RESPECTIVO RIEGO DE IMPREGNACION Y ASFALTO.
POR OTRA PARTE TENEMOS EJECUTADO EL MURO DE CONTENCION DE BLOCK 15X20X40 AL 100%. Y DEMOLICION DE 15X 30CMS.

NOTA NO. 6 22/DIC/2025

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO, ORDINARIA, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16/DIC/2025 AL 22/DIC/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$ 596,565.97
AMORT. ANTICIPO	$ 206,798.10
DEDUCCIONES	$ 15,428.43
LIQUIDO A PAGAR	$ 373,339.44


NOTA NO. 7 26/DIC/2025

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PISO DE CONCRETO DE 10 CMS ESPESOR. MODULADO EN LOSAS. CONCRETO $f'c = 200 kg/cm^2$.
FORJADO DE MARCO PERIMETRAL

→ LAMPARAS CUATRO PIEZAS, CON POSTE OCTOGONAL TABLERO BASKET BALL

DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

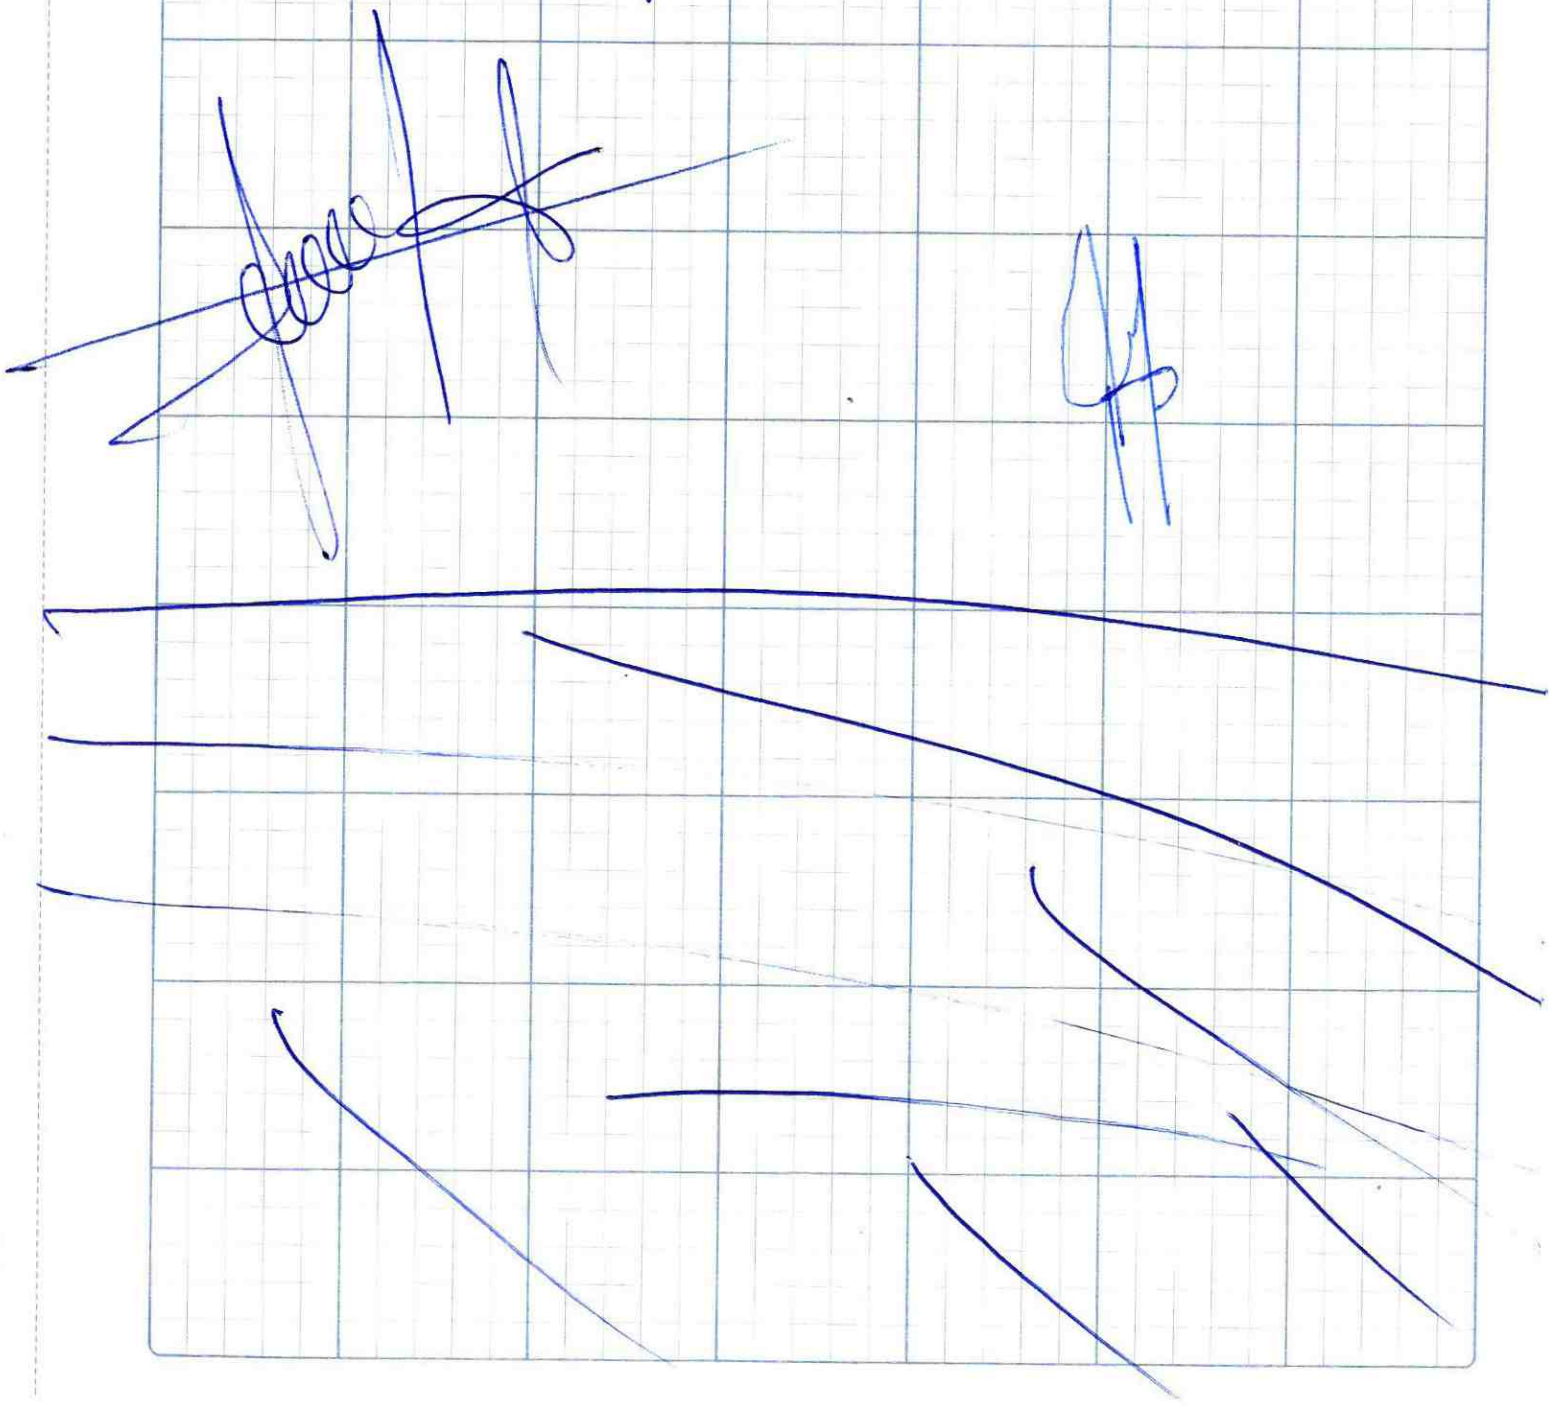

NOTA NO. 8 26/DIC/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 23/DIC/2025 AL 26/DIC/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$ 838,126.63
AMORT. ANTICIPO	$ 293,344.32
DEDUCCIONES	$ 21,675.69
LIQUIDO A PAGAR	$ 523,106.62.

NOTA NO. 9 26/DIC/2025

SE AUTORIZAN CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES, DADO QUE FUERON NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

NOTA NO. 10 31/DIC/2025

SE HAN ~~DECRETADO~~ EL TOTAL DE LOS VOLUMENES CONTEMPLADOS, CON ELLO LA CONCLUSION DE LAS METAS DE PROYECTO.

NOTA NO. 11 31/DIC/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES EXTRA ORDINARIA, FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 27/DIC/2025 AL 31/DIC/2025 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	=	274,987.58
AMORT. ANTICIPO	=	96,245.67
DEDUCCIONES	=	7,111.75
LIQUIDO A PAGAR	=	171,630.16

NOTA NO. 12 31/DIC/2025

SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS DE PROYECTO Y DEL CONTRATO.
