MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:**	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2025	**CALCULO:**	C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-316

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
		1--6	A-D	M2	17.00	27.00			459.00		
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA									**459.00**	
	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO.			M3	SEGÚN PROYECTO 375 M2			0.20	75.00		
										75.00	
	ALBAÑILERIA										
	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A-B	4--5	M2	1.00	11.85			11.85		
		C-D	2--3		1.00	11.85			11.85		
		1--6	B-C		1.00	14.70			14.70		
										38.40	
	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	A	1--6	ML	15.00				15.00		
		D	1--6		15.00				15.00		
		1	A-D		25.00				25.00		
		6	A-D		25.00				25.00		
										80.00	

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
Christian Alexis BE
CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO
ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:**	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2025	**CALCULO:**	C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-316

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	B	1--4	ML	9.88				9.88		
		B	5--6		3.53				3.53		
		C	1--2		3.53				3.53		
		C	3--6		9.90				9.90		
		4	A-B		11.70				11.70		
		5	A-B		11.70				11.70		
		2	C-D		11.64				11.64		
		2	C-D		11.64				11.64		
										73.52	
	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	A-B	1--4	M2	9.88	11.70			115.60		
		C-D	2--6		9.90	11.70			115.83		
										231.43	

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:**	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2025	**CALCULO:**	C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	A	1--6	M2	15.00	0.20			3.00		
		D	1--6		15.00	0.20			3.00		
		1	A-D		25.00	0.20			5.00		
		6	A-D		25.00	0.20			5.00		
		B	1--4		9.88	0.20			1.98		
		B	5--6		3.53	0.20			0.71		
		C	1--2		3.53	0.20			0.71		
		C	3--6		9.90	0.20			1.98		
		4	A-B		11.70	0.20			2.34		
		5	A-B		11.70	0.20			2.34		
		2	C-D		11.64	0.20			2.33		
		2	C-D		11.64	0.20			2.33		
										30.72	
	JARDINERIA										
	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	A-B	1--4	M2	9.88	11.70			115.60		
		C-D	2--6		9.90	11.70			115.83		
										231.43	

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: I	FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:**	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2025	**CALCULO:**	C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-316

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	A	5--6	ML	3.00				3.00		
		B	5--6		3.00				3.00		
		C	1--2		3.00				3.00		
		D	1--2		3.00				3.00		
		5.00	A-B		11.00				11.00		
		6.00	A-B		11.00				11.00		
		1.00	C-D		11.00				11.00		
		2.00	C-D		11.00				11.00		
										56.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.			PZA				1.00	1.00		
										1.00	

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE
CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: I	FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:**	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2025	**CALCULO:**	C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	MOBILIARIO URBANO										
	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.			**PZA**				2.00	2.00	**2.00**	
				LOTE				1.00	1.00		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA).									**1.00**	

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:**	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2025	**CALCULO:**	C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

ING. CHRISTIAN BAÑUELOS

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODELO ATENAS DE TUBO DE 1 1/2"CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.			PZA				2.00	2.00		
										2.00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS.			LOTE				1.00	1.00		
										1.00	
	INSTALACIONES ELECTRICAS										
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.			PZA				9.00	9.00		
										9.00	
	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION.			PZA				9.00	9.00		
										9.00	

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE
CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:**	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2025	**CALCULO:**	C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

ING. CHRISTIAN BAÑUELOS
CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.			PZA				9.00	9.00	**9.00**	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2+1 6 ALUMINIO SUBTERRANEO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.			ML	64.50				64.50		PARQUE
					10.00				10.00		CONEXIÓN
										74.50	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.			PZA				1.00	1.00		
										1.00	
	PORTA PLACAS Y SEÑALAMIENTOS										
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUCIBA DE 1.20 X 0.95 CMS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.			PZA				1.00	1.00	**1.00**	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PLACAS A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOSIDO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.			PZA				1.00	1.00	**1.00**	

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:18/JULIO/2025**	

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
1	**PRELIMINARES**								
1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2	459.00	459.00			459.00	$ 14.84	$ 6,811.56
1.2	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M3	75.00	75.00			75.00	$ 692.49	$ 51,936.75
1.3	CORTE Y ACARREO EN AREA DE TERRENO INESTABLE CON EQUIPO MECANICO CON 30% DE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO.	M3	112.50	112.50			112.50	$ 86.24	$ 9,702.00
								TOTAL PRELIMINARES	$ 68,450.31
2	**ALBAÑILERIA**								
2.1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO . CONCRETO ECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.40	38.40			38.40	$ 1,205.90	$ 46,306.56

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE.

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:18/JULIO/2025**		

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81035 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
2.2	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	**ML**	80.00	80.00			80.00	$ 537.06	$ **42,964.80**
2.3	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	**ML**	73.52	73.52			73.52	$ 432.33	$ **31,784.90**
2.4	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA	**M2**	226.91	226.91			226.91	$ 650.76	$ **147,663.95**
2.5	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	**M2**	30.70	30.70			30.70	$ 483.25	$ **14,835.78**
								TOTAL ALBAÑILERIA	$ **283,555.99**

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005		**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:18/JULIO/2025**	

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
Av. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
3	**MOBILIARIO URBANO**								
3.1	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO.	PZA	2.00	2.00			2.00	$ 5,980.76	$ **11,961.52**
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA).	LOTE	1	1			1	$ 149,839.44	$ **149,839.44**
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODELO ATENAS DE TUBO DE 1 1/2"CON DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	2	2			2	$ 19,908.27	$ **39,816.54**
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS.	LOTE	1	1			1	$ 137,403.74	$ **137,403.74**
								TOTAL MOBILIARIO URBANO	$ **339,021.24**

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTÉ DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005		**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:18/JULIO/2025**	

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81215 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
4	**JARDIN**								
4.1	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	**M2**	226.91	226.91			226.91	$ 700.02	$ **158,841.54**
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	**ML**	56.00	56.00			56.00	$ 200.03	$ **11,201.68**
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	**PZA**	6.00	6.00			6.00	$ 3,122.38	$ **18,734.28**
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	**PZA**	1.00	1.00			1.00	$ 1,474.17	$ **1,474.17**
								TOTAL JARDIN	$ **190,251.67**

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005		**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:18/JULIO/2025**	

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
Av. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81215 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	9.00	9.00			9.00	$ 12,474.15	$ **112,267.35**
5.2	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	9.00	9.00			9.00	$ 1,375.74	$ **12,381.66**
5.3	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	9.00	9.00			9.00	$ 2,508.14	$ **22,573.26**
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	70.00	70.00			70.00	$ 111.34	$ **7,793.80**
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	30.00	30.00			30.00	$ 90.94	$ **2,728.20**

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005		**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:18/JULIO/2025**	

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
Av. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81215 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.	**PZA**	1.00	1.00			1.00	$ 18,861.36	**$ 18,861.36**
5.7	SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO	**PZA**	1.00	1.00			1.00	$ 23,879.52	**$ 23,879.52**
5.8	PROYECTO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN BAJA TENSION	**PZA**	1.00	1.00			1.00	$ 23,216.20	**$ 23,216.20**
								TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	**$ 223,701.35**
6	**VARIOS**								
6.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	**PZA**	1.00	1.00			1.00	$ 4,727.51	**$ 4,727.51**

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE
CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005		**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:**	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:18/JULIO/2025**	

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
Av. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00	1.00			1.00	$ 3,944.39	$ 3,944.39
6.3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	459.00	459.00			459.00	$ 16.05	$ 7,366.95
								TOTAL VARIOS	$ 16,038.85

IMPORTE SIN I.V.A.	1,121,019.41
IVA (16%)	179,363.11
Total:	1,300,382.52

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-850505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:** 18 DE JULIO DEL 2025	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PRELIMINARES	**$68,450.31**
ALBAÑILERIA	**$283,555.99**
MOBILIARIO URBANO	**$339,021.24**
JARDIN	**$190,251.67**
INSTALACION ELECTRICA	**$223,701.35**
VARIOS	**$16,038.85**

SUB-TOTAL DE OBRA:	$1,121,019.41
I.V.A. (16%):	$179,363.11
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	**$1,300,382.52**
DEDUCCIONES:	
Amortización 35.00%	$455,133.88
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	$33,630.58
Suma de deducciones	**$488,764.46**
Neto a pagar de esta estimacion:	**$811,618.06**

(Son: OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.)

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**IMPORTE:** $ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	**FECHA:** 18 DE JULIO DEL 2025	**HOJA:** 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.	**$1,121,019.41**
SUB-TOTAL DE OBRA:	$1,121,019.41
I.V.A. (16%):	$179,363.11
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	**$1,300,382.52**
DEDUCCIONES:	
Amortización 35.00%	$455,133.88
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	$33,630.58
Suma de deducciones	**$488,764.46**
Neto a pagar de esta estimacion:	**$811,618.06**

(Son: OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.)

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005		**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025			
IMPORTE CONTRATO:	$1,300,382.52 CON I.V.A.	**IMPORTE ANTICIPO:**	$455,133.88	CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		**FECHA:** 18 DE JULIO DEL 2025		**HOJA:** 1 DE 1

ING. CHRISTIAN BAÑUELOS

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-316

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %				AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNO)	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	$1,300,382.52	$33,630.58				$455,133.88	$488,764.46	**$811,618.06**
TOTALES		**$1,300,382.52**	$33,630.58				$455,133.88	$488,764.46	**$811,618.06**
SALDO DEL CONTRATO:		$0.00	**SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO**				$0.00		

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE.

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3J6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE
CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3J6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO



POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81815 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3J6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO





POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE
CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO





POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

Christian Alexis BE.

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO





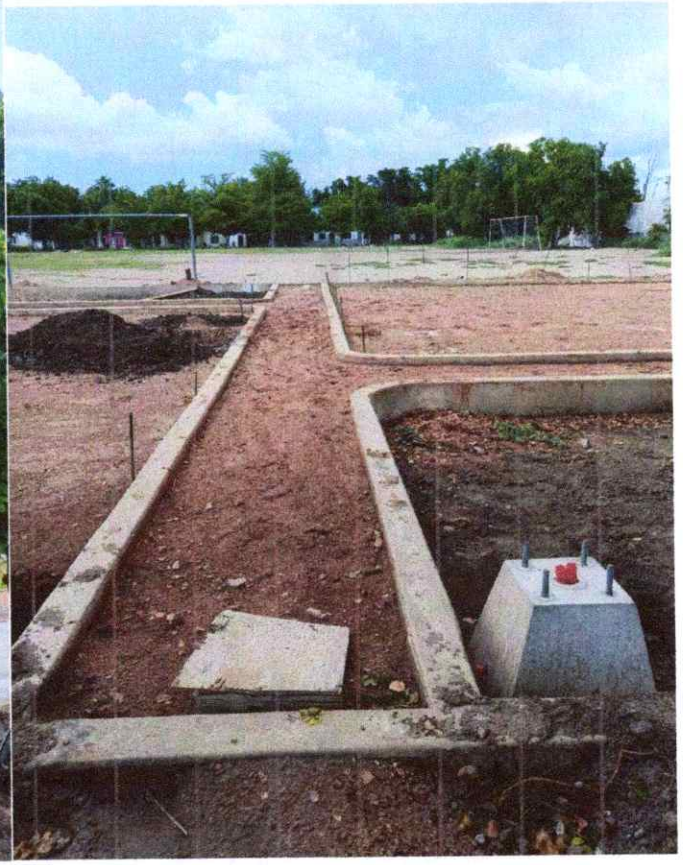

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO





POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO





POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:


ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO



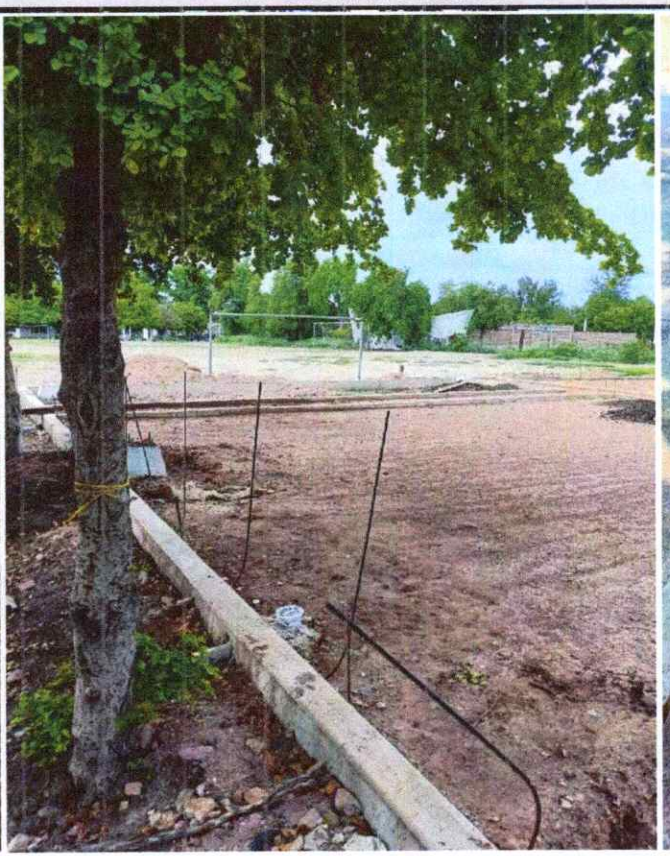



POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME


ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO



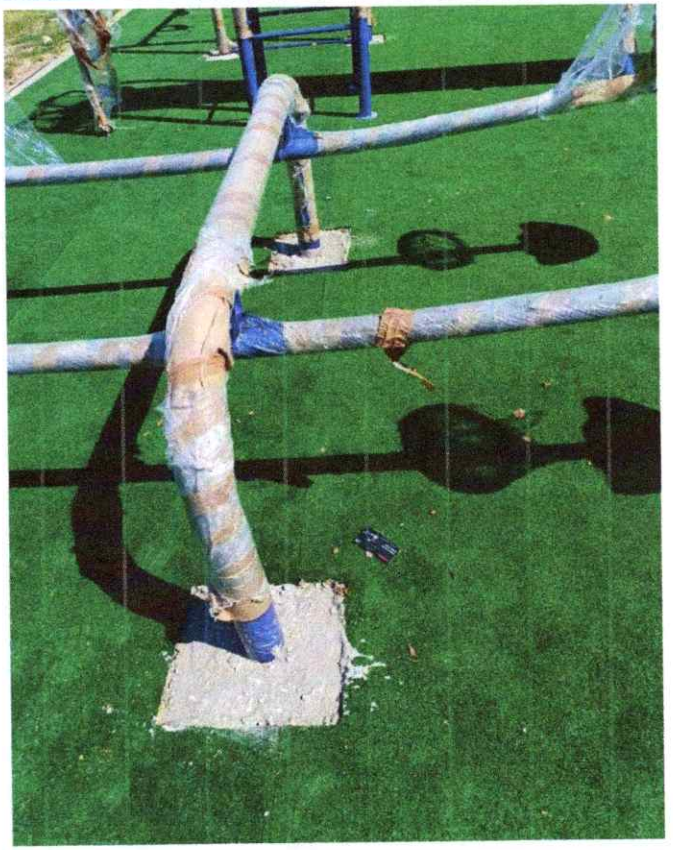

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3B6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO

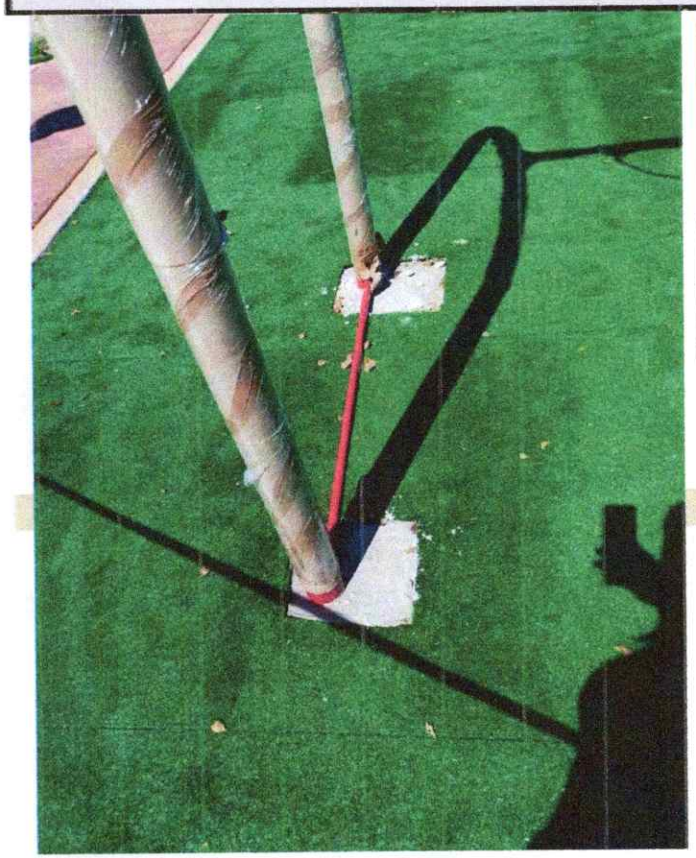



POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR


MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6

REPORTE FOTOGRAFICO



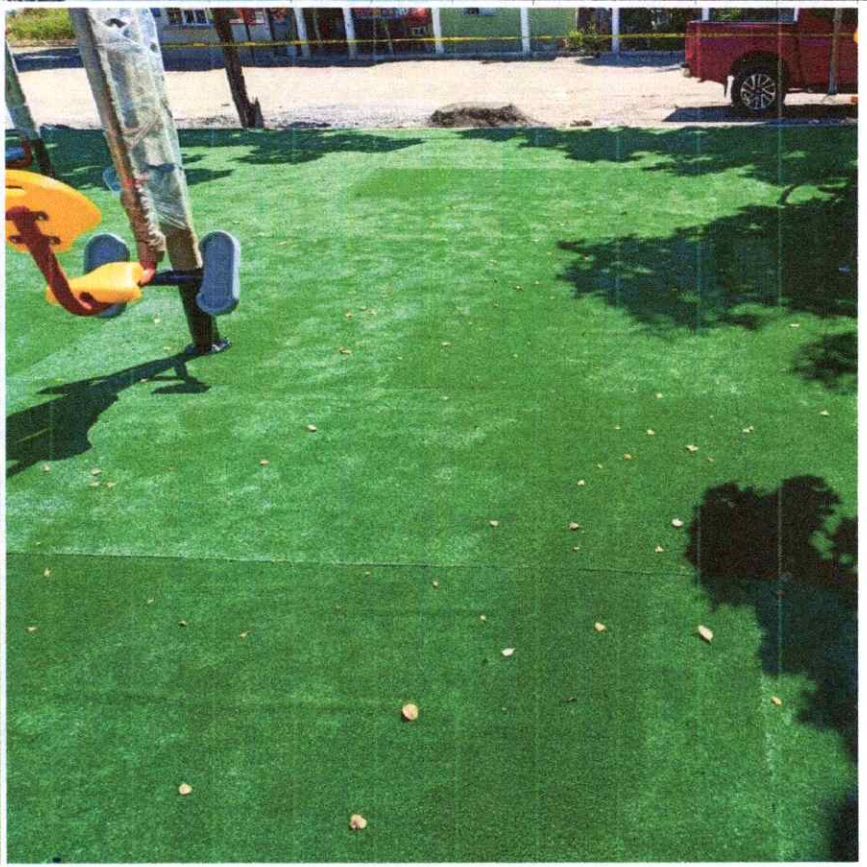

POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SIANALOA ESTADO DE SINALOA.			CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA AV. VICENTE GUERRERO No. 25, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 81015 GUASAVE, SINALOA R.F.C. BAEC-950505-3I6
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-005	**PERIODO CONTRATO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025		
IMPORTE CONTRATO:	$ 1,121,019.41 SIN I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: $ 455,133.88 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	**PERIODO:** DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	FECHA: 18 DE JULIO DEL 2025	

REPORTE FOTOGRAFICO





POR LA CONSTRUCTORA
C. CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA

CHRISTIAN ALEXIS BAÑUELOS ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONFORME:

ING. MARIO JOVANY ALVAREZ CASTRO
SUPERVISOR
