CONT. Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 30/04/2025 1

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA LA OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE 21 DE MARZO DE CALLE MARZO A CALLE ALAMEDA (QUE EN EL CONTRATO DICE ALMENDRA), FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, CON EL CONTRATO Nº: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA C. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUASIGUIENTE SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", ESTE CONTRATO ES POR UN MONTO TOTAL DE $5'995,818.01; SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 01/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUIDO Y QUE DEBERÁ SER EJECUTADA EN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 154 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES, DEL 30 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

TAMBIEN EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN, EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 Y EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE QUE SERA EL ING. MIGUE ANGEL CORRALES FIGUEROA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 10030091 OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA, DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES, QUIEN SERÁ EL QUE HAGA LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN ESTA BITACORA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISIÓN DE SOP

POR LA CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL CORRALES F.

POR LA SECRETARIA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA A.

CONT. Nº- OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 30/04/2025

NOTA Nº (1) CON ESTA FECHA TAMBIEN NOS TRASLADAMOS AL SITIO DEL LUGAR DONDE SE VA A LLEVAR A CABO ESTA OBRA, EN CALLE 21 DE MARZO Y CALLE MARZO DEL FRACCIONAMIENTO STASE, EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, PARA HACERLE ENTREGA A LA CONTRATISTA DEL INMUEBLE QUE ES EL TRAMO DE ESTA CALLE DE CALLE MARZO HASTA CALLE ALAMEDA (QUE EN EL CONTRATO DICE EQUIVOCADAMENTE ALMENDRA)

SE QUEDA PERSONAL DE LA CONTRATISTA CON EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA TRABAJANDO PARA PASAR NIVELES Y LLEVAR A CABO EL TRAZO PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE SONDEO PARA LOCALIZAR LAS INSTALACIONES, TAMBIEN AL HACER EL RECORRIDO SE APRECIAN ARBOLES GRANDES DENTRO DEL ARROYO DE LA CALLE, AL IGUAL QUE POSTES DE TELEFONOS.


05/05/2025

NOTA Nº (2) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA DONDE SE APRECIA COMO YA SE TIENEN LOCALIZADAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y SE TRABAJA EN LA INTRODUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 3"Ø CON EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, TAMBIEN SE SOLICITARÁ PERMISO PARA LA TALA Y PODA DE ARBOLES AL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y A TELMEX SE SOLICITARÁ LA MOVILIZACION DE SUS POSTES PARA SACARLOS DEL ARROYO DE LA CALLE, YA SE CUENTA EN LA OBRA CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 8" PARA LA ATARJEA Y DE 6"Ø P/LAS DESCARGAS, ASI COMO CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA LAS EXCAVACIONES, CAMION DE VOLTEO, Y RODILLO COMPACTADOR REVOLVEDORA Y PLACA VIBRATORIA (BAILARINA)

CONT. Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 12/05/2025 3

NOTA Nº(3) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION PUEDE VER COMO YA SE ESTA TRABAJANDO EN LA EXCAVACIÓN, TENDIDO DE CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 8"Ø PARA ATARJEA DE LA CALLE MARZO A LA CALLE ABRIL DONDE SE COLOCARAN TODAS LAS DESCARGAS DE ESTA CUADRA, TAMBIEN SE VAN DEJANDO LAS CONEXIONES (YEE DE 8"Ø, REDUCCION DE 8" A 6" Y LOS CODOS DE 45° DE 6". LUEGO SE LLEVA A CABO EL ACOSTILLADO Y EL RELLENO CON MATERIAL LIMO ARENOSO 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, TAMBIEN SE ESTÁ SONDEANDO PARA LOCALIZAR EL COLECTOR Y CHECAR NIVELES, SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA SEÑALIZAR BIEN LA OBRA CON MINIPOSTES CINTA Y CACHIMBAS O NECHEROS PARA EVITAR EN LO POSIBLE LOS ACCIDENTES.

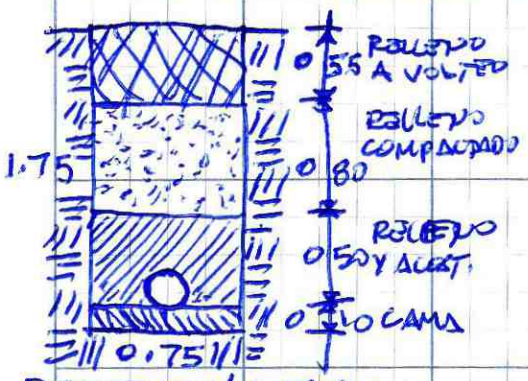

RELLENO Y ACOSTILLADO PARA TUBERIA DE 8"

19/05/2025


NOTA Nº(4) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA DONDE SE APRECIA COMO YA SE TIENE INICIADA LA EXCAVACIÓN PARA LA COLOCACION DEL COLECTOR CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 24"Ø DE PARED SOLIDA SERIE 20 CON JUNTA HERMETICA, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LAS DESCARGAS EN LA ATARJEA EN EL TRAMO DE LA CALLE ABRIL A LA CALLE ALAMEDA, YA SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 3"Ø EN TODO EL TRAMO DESDE LA CALLE MARZO HASTA LA CALLE ALAMEDA Y TAMBIEN SE INICIARON LOS POZOS CABEZA Y DE LLEGADA PARA LA LINEA DE LA MARINA.

CONT. Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 26/05/2025 4

NOTA Nº (5) AL LLEVAR A CABO LA VISITA DE ESTE DÍA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO YA SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA DEL COLECTOR DE LA CALLE MARZO A LA CALLE ABRIL Y SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL RELLENO SOBRE ESTA TUBERIA Y SE ESTA HACIENDO EL PRIMER POZO PARA EL COLECTOR EN LA BOCACALLE DE 21 DE MARZO CON CALLE MARZO, TAMBIEN SE TERMINARON LAS DESCARGAS.

MEDIDAS PROMEDIO DE ANCHO Y PROFUNDIDAD PARA COLECTOR DE 24" (61 CM)

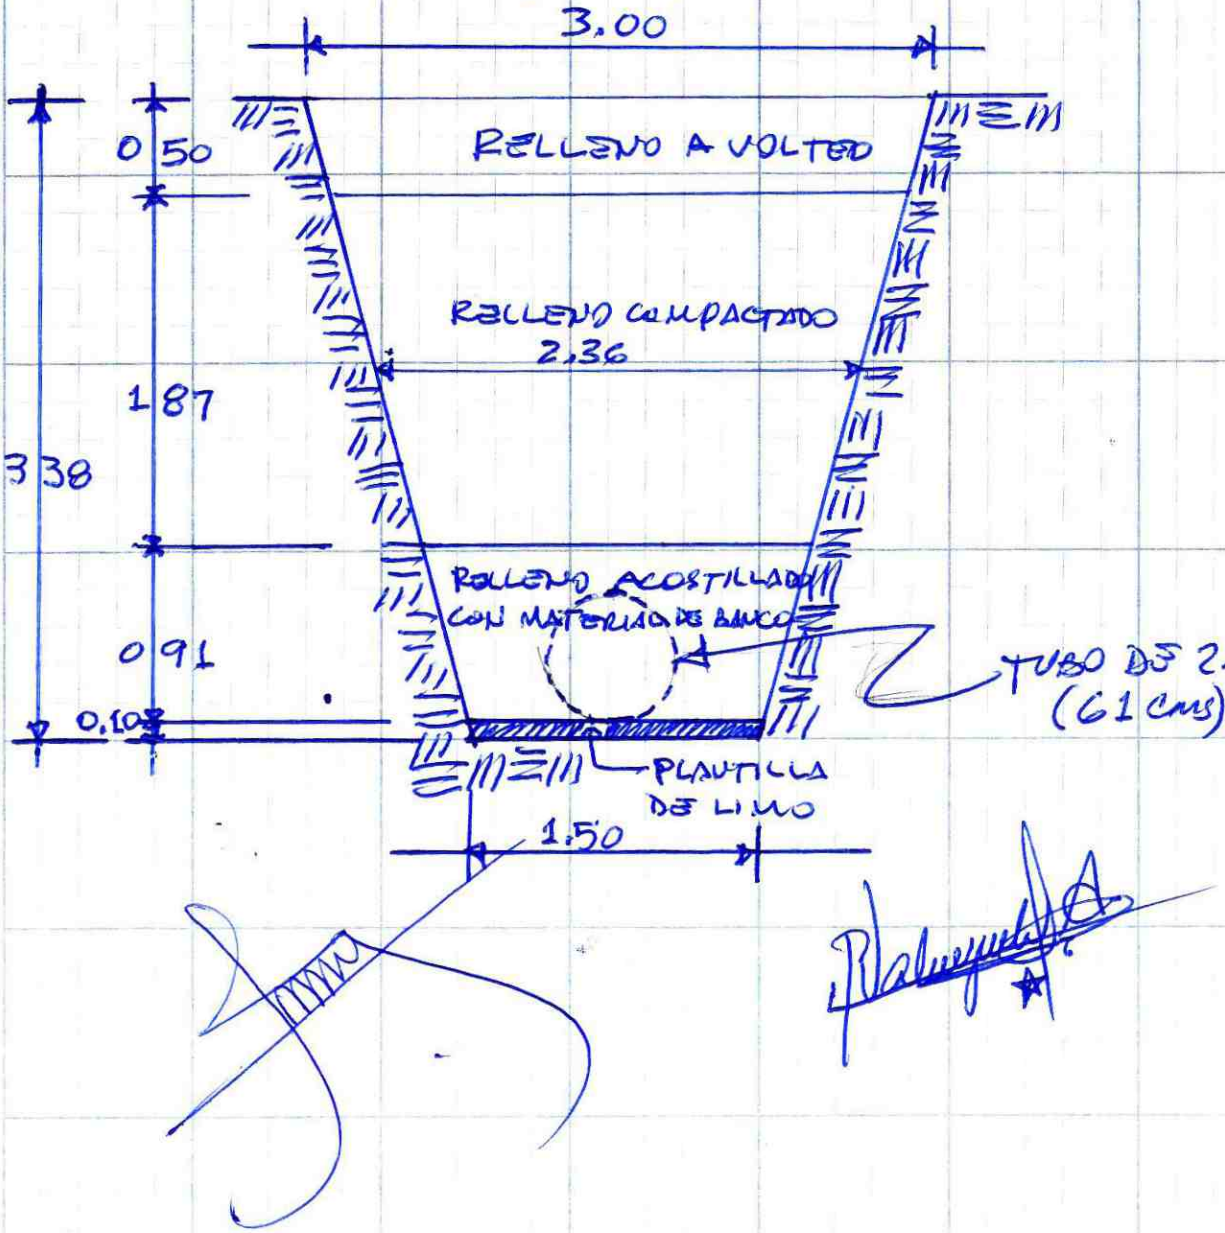

CONT. Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 30/05/2025

NOTA Nº (6) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE APRECIA COMO SE TIENE YA COLOCADA LA TUBERÍA DE 24"Ø PARA EL COLECTOR HASTA LA CALLE ALAMEDA, LA CUAL SE TENDRÁ QUE CRUZAR CON LA TUBERÍA PARA LLEGAR AL POZO QUE SE ENCUENTRA COMO A 15.00 MTS. DESPUÉS DE LA CALLE, A DONDE NOS VAMOS A CONECTAR, TAMBIEN SE TRABAJA CON LOS RELLENOS COMPACTADOS CON BAILARINA Y SE INICIA CON LA HECHURA DEL POZO DE VISITA EN LA BOCACALLE DE LA ABRIL Y TAMBIEN SE ESTÁ INICIANDO CON EL CORTE EN TERRENO NATURAL PARA ABRIR CAJA PARA PREPARAR EL TERRENO PARA INICIAR CON EL TIRO DE MATERIAL DE SUB-BASE

03/06/2025

NOTA Nº (7) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (1) NORMAL, CON UN PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2025 POR UN IMPORTE LIQUIDO A PAGAR DE $742,164.38; SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, CONTANDO A ESTA FECHA CON UN AVANCE APROXIMADO DE 15%

CONT. Nº OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-2204-A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 10/06/2025 6

NOTA Nº (8) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIA COMO SE CONTINUA CON EL CORTE DE TERRENO NATURAL Y RETIRO DE PRODUCTO DE ESTE CORTE EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LINEA NUEVA DE PVC HIDRAULICA DE 3"Ø Y EN LA HECHURA DE REGISTROS PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS CON TABIQUE ROJO RECORRIDO, CON CLARO DE 40x60 CMS.

SE TRABAJA TAMBIEN EN LA HECHURA DE POZO DE VISITA PARA EL COLECTOR EN LA BOCACALLE DE LA ABRIL

17/06/2025

NOTA Nº (9) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION DE ESTA OBRA LA SOLICITUD DE LAS OBRAS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SE REVISARAN Y SE PASARAN PARA QUE SE ANALICEN A LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION, Y A QUE LAS PASEN EN LIMPIO, ENUMERADAS, CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, COTIZACIONES, DAN UN TOTAL DE 16 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y DAN UN MONTO TOTAL DE $463,294.62, SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 62/100 M.N., YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16% (IVA), QUEDANDO DENTRO DEL MONTO DE LO CONTRATADO.

CONT. Nº- OPPU - EST. - LP - PEST - VIAL - 2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 24/06/2025 7

NOTA Nº (10) DURANTE LA VISITA A ESTA OBRA SE APRECIA COMO SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA TUBERIA HIDRAULICA DE 3"Ø ABRAZADERA DE BRONCE DE 3"x1/2" TAMBIEN SE ESTAN HACIENDO RELLENOS COMPACTADOS C/BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CMS APLICANDO AGUA PARA HUMEDECER Y LOGRAR MEJOR COMPACTACION DE HASTA UN 95%, EL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SE RETIRA EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA. ESTA SUPERVISION RECOMIENDA A EL CONTRATISTA SEÑALIZAR BIEN LA OBRA PARA EVITAR ACCIDENTES.

MACÍ

30/06/2025

NOTA Nº (11) SE VISITA LA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO YA SE TRABAJA EN DAR NIVEL A LOS POZOS DE VISITA, YA QUE SE TIENE EL TIRO DE MATERIAL PARA SUB-BASE, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA HECHURA DE REGISTROS SANITARIOS DE BANQUETA, TAMBIEN SE TIENE BOMBA TRABAJANDO PARA PASA AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO.

YA SE TERMINARON DE LLEVAR A CABO TODOS LOS RELLENOS EN COLECTOR ATARJEAS Y DESCARGAS SANITARIAS

MACÍ

03/07/2025

NOTA Nº (12) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACION Nº (2) NORMAL POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE $766,299.56, SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE DEL 40%

MACÍ

NOTA Nº (13) SE VISITA ESTA OBRA DONDE SE OBSERVA COMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTACION DE BASE TRITURADA PARA COMPACTARSE AL 100% Y EN LA HECHURA DE REGISTROS SANITARIOS DE BANQUETA TAMBIEN SE ESTÁ TRABAJANDO, EN LA COLOCACION DE LLAVES DE BANQUETA Y BOTAS, SE CONTINUA CON LA COMPACTACION DEL RELLENO PARA BANQUETAS.

17/07/2025

NOTA Nº (14) HOY SE LLEVA LA VISITA A ESTA OBRA POR LA SUPERVISION, DONDE SE APRECIA COMO YA SE TERMINO DE COMPACTAR TODO EL TRAMO Y SE ESTA PREPARANDO PARA COLOCAR CIMBRA PARA GUARNICIONES, DESPUES DE HABER IMPREGNADO Y ARENEADO Y SE TRABAJA EN LA REINVOLACION DE POZOS Y POR LA TARDE SE INICIARÁ CON EL COLADO DE GUARNICIONES EN EL LADO SUR DE LA CALLE, CON CONCRETO PREMEZCLADO DE $F'C = 250 Kg/cm^2$ (GUARNICION TIPO "L")

24/07/2025

NOTA Nº (15) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO YA SE TIENE COLADA TODA LA GUARNICION DEL LADO SUR DE LA CALLE Y MAS DE 100.00 ML. DE BANQUETA COLADA Y SE TIENE PREPARADO PARA COLAR 50,00 ML MAS, TAMBIEN SE APRECIA COMO YA SE TIENE CASI TODOS LOS REGISTROS TERMINADOS Y LAS LLAVES DE BANQUETA Y BOTAS PUESTAS, TAMBIEN SE ESTA COLOCANDO CIMBRA PARA GUARNICION EN EL LADO NORTE DE LA CALLE

NOTA Nº (16) AL LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE VE COMO YA SE TIENE COLADA LA BANQUETA DE LADO NORTE Y POR SUPUESTO TAMBIEN TODA LA GUARNICION HASTA LA CALLE ABRIL Y SE COLARON TAMBIEN LAS PRIMERAS LOSAS DE LADO SUR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 300 Kg/cm² T.M.A. 1½" EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON LA UTILIZACION DE VIBRADOR, ACABADO RAYADO, CURADO Y LA COLOCACION DE CONTRA JUNTA TIPO C-2 PVC PARA LOSAS DE 15 CMS EN PAVIMENTOS TAMBIEN SE CUENTA EN LA OBRA CON EL ACERO DE REFUERZO LISO PARA PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO.

NOTA Nº (17) CON ESTA FECHA TAMBIEN LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (3) NORMAL POR UN IMPORTE TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE $1'517,838.16 SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA

CONT. Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 07/08/2025

NOTA Nº (18) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO YA SE ESTÁ COLANDO LA BANQUETA DE LADO NORTE, DONDE SE VIENEN TERMINANDO LOS REGISTROS SANITARIOS DE BANQUETA DE LA CALLE MARZO HACIA LA CALLE ABRIL, DONDE SE ESTAN COLANDO LOS ABANICOS DE LAS 2 ESQUINAS Y DEJANDO LAS RAMPAS PARA MINUSVALIDOS, POR LA TARDE SE COLARAN LOSAS HASTA DONDE SE TIENE COLADAS LAS BANQUETAS 0+080 APROXIMADAMENTE

14/08/2025

NOTA Nº (19) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION PUEDE APRECIAR COMO YA SE TIENE TERMINADO EL COLADO DE TODA LA BANQUETA DEL LADO NORTE, DONDE SE COLOCARON TODAS LAS LLAVES Y BOTAS DE LAS TOMAS DE AGUA POTABLE Y SE TERMINARON TODOS LOS REGISTROS SANITARIOS DE BANQUETA Y PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO TERMINARAN DE COLAR LOS TRAMOS DE LOSAS QUE FALTAN

21/08/2025

NOTA Nº (20) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE OBSERVA COMO YA HAN QUEDADOS TERMINADOS TODOS LOS COLADOS DE CONCRETO Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE GUARNICIONES Y EN LOSAS EN LAS AREAS DONDE SE VA A PINTAR

CONT. Nº OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 28/08/2025 11

NOTA Nº (21) CON ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO YA HAN QUEDADO PINTADAS LAS GUARNICIONES, LA RAYA EN LA CALLE (LOSAS), LA CEBRA EN LA BOCACALLE DE LA CALLE ABRIL, ASI COMO LAS RAMPAS CON LA FIGURA PARA MINUSVALIDOS, TAMBIEN SE COLOCO EL SEÑALAMIENTO DE ALTO EN CALLE MARZO Y LLEGADA A CALLE ALAMEDA (QUE ES EL NOMBRE REAL) YA QUE EN CONTRATO TRAIA EL NOMBRE DE CALLE ALMENDRA.

CON ESTO SOLO QUEDA PENDIENTE LA COLOCACION DE LAS LAMPARAS P/ALUMBRADO PUBLICO, INCLUIDO EL ARBOTANTE, QUE SON CONCEPTO EXTRAORDINARIO (YA AUTORIZADO), COMO TODOS LOS SOLICITADOS EN SU MOMENTO.

29/08/2025

NOTA Nº (22) CON ~~ESTA~~ FECHA EL CONTRATISTA PRESENTO A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (4) NORMAL, SE REVISO Y SE FIRMO, SIENDO POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR DE $67,943.05; SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N., YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS.

NOTA Nº (23) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO YA SE ~~ESTAN~~ COLGANDO LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE POSTES METÁLICOS, SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL CABLEADO Y SE CONECTARÁ PARA CHECAR SU FUNCIONAMIENTO POR LA NOCHE, QUEDARÁ PENDIENTE LA LIMPIEZA EN LA OBRA HASTA EL DÍA QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON SU MADUREZ PARA RETIRAR TAMBIEN LOS TAPONES COLOCADOS EN LAS BOCACALLES.

15/09/2025

NOTA Nº (24) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACION Nº (5) ADICIONAL POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR DE $372,681.61; SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISÓ Y SE FIRMA PARA SU COBRO, AMPARADA CON EL CONVENIO POR CAMBIOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Nº CONV-01-2025-CCCT-C2204A-2025 DE ESTE CONTRATO

CONT. Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 23/09/2025 13

NOTA Nº (25) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUDO VER COMO YA SE ENCUENTRA LIMPIA, YA SE RETIRARON LOS TAPONES QUE HABIA CON TIERRA EN LAS BOCACALLES, SE LEVANTO CON RETROEXCAVADORA Y SE CARGO EN CAMION PARA TIRARLA FUERA DE LA OBRA, YA QUEDO LIBRE A LA CIRCULACION VEHICULAR, CON ESTO SE DA POR TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA, QUEDANDO PENDIENTE LA ESTIMACION FINIQUITO PARA TAMBIEN CERRAR LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.

30/09/2025

NOTA Nº (26) HOY LA CONTRATISTA PRESENTO A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (6) EXTRAORDINARIA FINIQUITO POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 275,289.33 ; SON ; DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. CON EL 16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISO LAS AUTORIZACIONES Y SE AMPARA CON EL CONVENIO POR CAMBIO AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Nº CONV-01-2025-CCCT-CR2204A-2025 Y CON ESTO SE DA POR CERRADA ESTA BITACORA DE OBRA TAMBIEN
