

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

Navolato, Sinaloa a 27 de oct. de 2022.

C.P. MARCOS VINICIO VERÁSTICA CASILLAS

Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Navolato.

Presente:

MARCO JURÍDICO:

En cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el Artículo 40 Fracción IX inciso c), que instruye a los Testigos Sociales a emitir al final de su participación en los procesos de Licitación, el TESTIMONIO correspondiente del cual entregarán un ejemplar a los órganos internos de control:

Presento a usted este TESTIMONIO como resultado del procedimiento de Licitación que me fue asignado en mi carácter de Testigo Social con registro No. 004, mediante oficio No. AYUNAV/OIC-343/2022, con fecha 15 de septiembre de 2022, para participar en la Licitación Pública Nacional referente a la obra: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.** Este proceso de Licitación Pública fue realizado por el Comité de Obras del Ayuntamiento de Navolato por conducto de la Dirección de Obras Públicas, de acuerdo con la convocatoria publicada en Compra-net, con número de identificación 004/2022.

La licitación se desarrolló con fundamento en los artículos 39 fracción número I, y 43 fracción número I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

CRONOLOGIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

I – REVISIÓN DE CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PUBLICAN EN COMPRA NET RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN.

Los trabajos se inician con la revisión de la documentación que fue publicada en la plataforma Compra-Net/Ayuntamiento de Navolato, y que consisten en: La convocatoria, bases de la licitación, catálogo de conceptos, especificaciones y proyecto ejecutivo.

- La convocatoria pública No. 004 que corresponde a la presente licitación, establece que la contratación será a base de precios unitarios y tiempo determinado, EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRESENTES TRABAJOS SERÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DE FONDO DE APORTACIONES

ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY, TESTIGO SOCIAL: No. DE REGISTRO: 004

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.


PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2022. de este Ayuntamiento de Navolato, de conformidad con las siguientes fechas programadas para los eventos:

1. Visita al lugar de la obra: 21 de septiembre de 2022 a las 12:00 HRS.
2. Junta de aclaraciones: 23 de septiembre de 2022 a las 10:30 A. M.
3. Presentación y apertura de propuestas: 04 de octubre de 2022 a las 13:00 Hrs.
4. Fecha probable de fallo: 18 de octubre de 2022 a las 14:00 Hrs.
5. Fecha probable de inicio de obra: 24 de octubre de 2022
6. Fecha de terminación de obra: 05 de diciembre de 2022 (43 días calendario)

La convocatoria contempla que el Presupuesto Base de la presente obra es de: \$ 2´714,320.06 (Son Dos millones setecientos catorce mil trescientos veinte pesos 06/100 M.N.) con IVA incluido, y que se otorgará un anticipo del 35% del monto contractual.


Las BASES de la Licitación establecen con claridad los lineamientos, criterios y métodos que se deberán aplicar en la integración de las propuestas técnicas y económicas, así como en los procesos de revisión, análisis y evaluación de las mismas, para de ahí obtener el ganador del contrato de la obra referida.

PAVIMENTACIÓN:

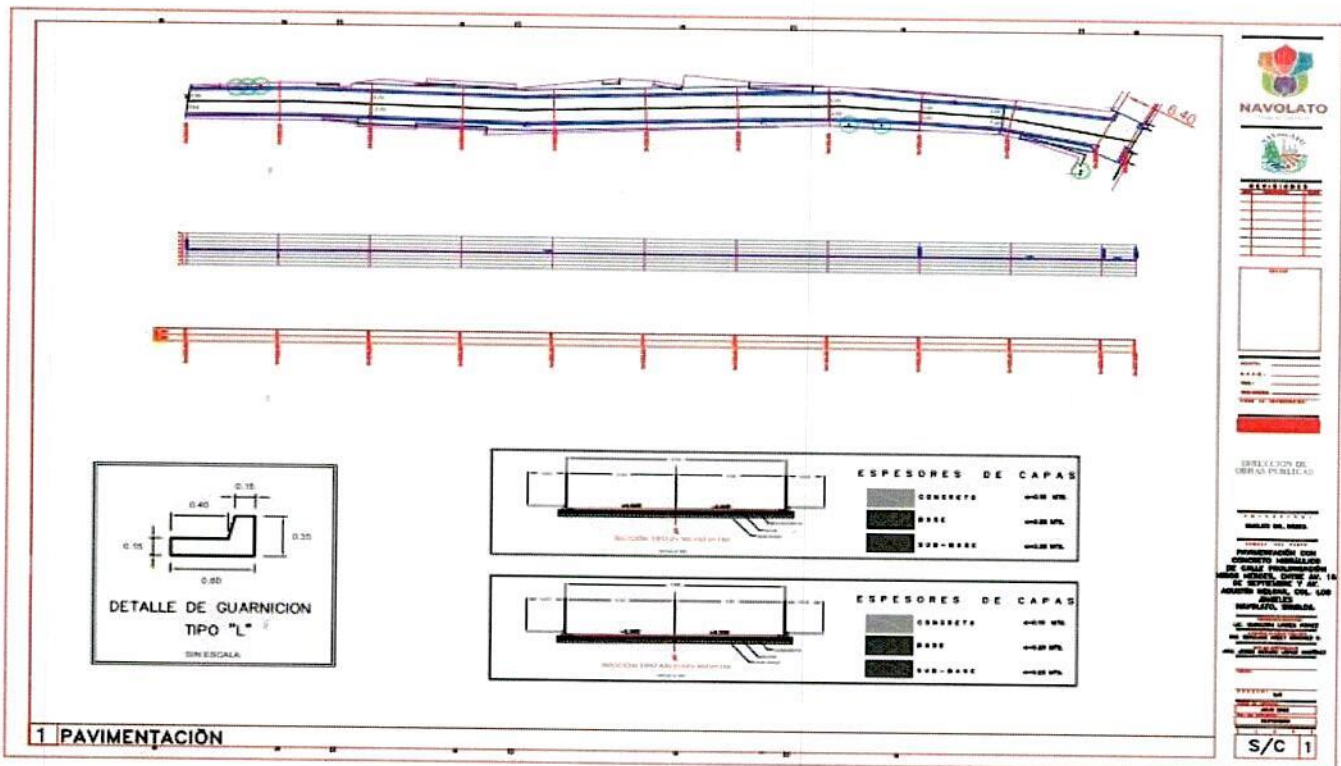

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

ALUMBRADO PÚBLICO:

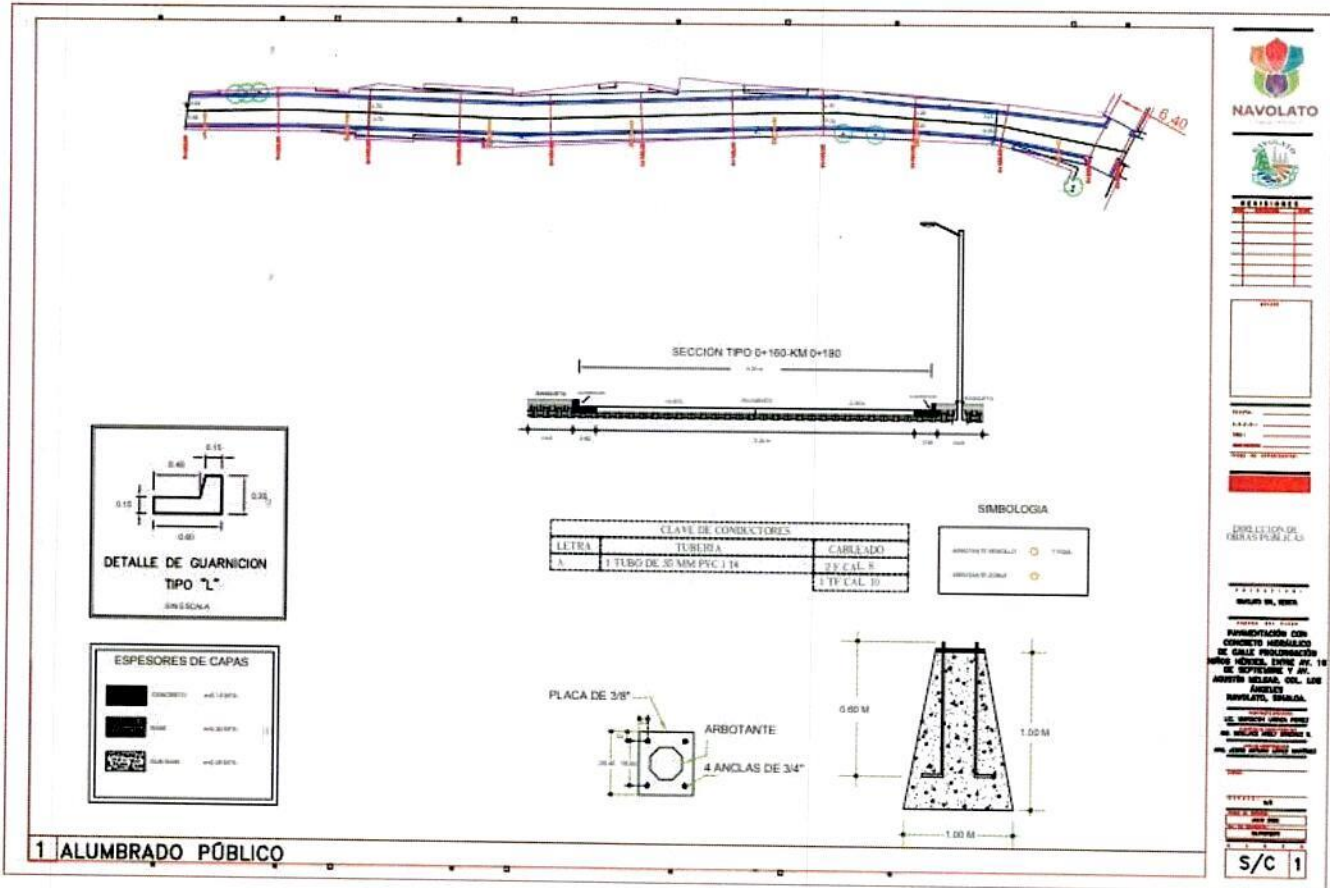

Se concluye que la documentación publicada en la plataforma Compra Net, cumple con las disposiciones establecidas en los artículos del 43 al 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por lo que es adecuado para realizar el proceso de licitación.

II – VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Se cumplió con lo establecido en la convocatoria; el día 21 de sept. de 2022 a las 12:00 Hrs. se desarrolló la visita al sitio donde se ejecutarían los trabajos que son motivos del contrato y durante este acto los asistentes inspeccionaron el sitio e hicieron las valoraciones de los elementos que se requieren para analizar los grados de dificultad y realizar las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

En éste acto se contó con la presencia de: Arq. Casandra Carolina Morales Lugo, presidente suplente del Comité de Obras; Ing. Juan Carlos Rodelo López vocal suplente, del Órgano Interno

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

de Control; y el Ing. Carlos Enrique Acosta Ley, Testigo Social con registro No, 004; y asistió Carlos Santiesteban Escalante y no se presentó Emilio Contreras Mendoza.

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA:



**H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022

Constancia de visita al sitio de los trabajos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, relativa a la obra de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

Se hace constar que los licitantes que se mencionan a continuación asistieron a la visita de obra relativa a la licitación arriba mencionada; los licitantes con motivo de esta visita inspeccionaron el sitio e hicieron las valoraciones de los elementos que se requieren para analizar los grados de dificultad y realizar las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

No	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.	Carlos Santiesteban	[Firma]
02	EMILIO CONTRERAS MENDOZA.	NO SE PRESENTO	
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			

ACERTAMENTE
Navolato, Sinaloa, A 21 de Septiembre del 2022

[Firma]
ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS MUNICIPALES
Y JEFA DEL DPTO. DE EVALUACIÓN TÉCNICA

[Firma]
Testigo Social
No. 04

HORA DE INICIO 12:00 P.M.
1:00 P.M.

[Firma]
Social Naval del JTC

III – JUNTA DE ACLARACIONES

Siendo las 10:30 Hrs. Del día 23 de septiembre de 2022 se desarrolló la reunión correspondiente a la junta de aclaraciones en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de éste municipio, contándose con la presencia por parte de los licitantes:

**TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.**

Por la empresa: Carlos Santiesteban Escalante - - - - - Eduardo Santiesteban Escalante
Por la empresa: Emilio Contreras Mendoza: - - - - - NO SE PRESENTÓ.

POR EL COMITÉ DE OBRA:

Arq. Casandra Carolina Morales Lugo: Presidente suplente del Comité de Obra
Ing. Juan Carlos Rodelo López: Vocal suplente del Comité por el Órgano Interno de Control

Representante del Órgano Interno de Control.

Arq. Darío Samuel Sarabia Caballero:

TESTIGO SOCIAL ASIGNADO A LA LICITACIÓN

Ing. Carlos Enrique Acosta Ley:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES:



NAVOLATO
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022



MINUTA DE REUNIÓN DE ACLARACIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, RELATIVO A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN AV. BENITO JUÁREZ S/N DE LA COLONIA PRIMAVERA 2, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80124, CON NÚMEROS TELEFÓNICOS (672) 727 09 33 EXT. 1401, LAS EMPRESAS Y EL PERSONAL DE LA CONVOCANTE PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO ANTERIORMENTE MENCIONADO.

PRESENTE ESTE ACTO, LA ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRAS MUNICIPALES Y JEFA DEL DPTO. DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ING. JUAN CARLOS RODELO LÓPEZ VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL ARQ. DARIO SAMUEL SARABIA CABALLERO COMO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, COMO TESTIGO SOCIAL EL ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY TESTIGO SOCIAL No. 004.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, TRACCIÓN III, DE LA LEY Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN SU PUNTO 3.1, LA CONVOCANTE ESTABLECIÓ QUE EL CONTRATISTA PUEDE SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA A "EL AYUNTAMIENTO", EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN AV. BENITO JUÁREZ S/N DE LA COLONIA PRIMAVERA 2, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80124, CON NÚMEROS TELEFÓNICOS (672) 727 09 33 EXT. 1401, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SEAN RECIBIDAS A MÁS TARDAR 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES INDICADA EN EL PUNTO 4.4.2 DE LAS BASES A LA LICITACIÓN.

CONFORME A LO ANTERIOR, SE PROCEDE A DAR RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS LICITANTES.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:
NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS POR ACLARAR POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SE PROCEDE A FIRMAR LA PRESENTE ACTA POR PARTE DE LOS ASISTENTES, PARA PROCEDER A ENTREGAR UNA COPIA A LOS MISMIOS Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN UN LUGAR VISIBLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN AV. BENITO JUÁREZ S/N DE LA COLONIA PRIMAVERA 2, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80124, AL QUE TENDRÁ ACCESO EL PÚBLICO, Y SE PUBLICARÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRA NET-SINALOA PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO ASISTIERON A ESTE ACTO, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES.

NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 10:50 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.



NAVOLATO
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022



POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

ING. JUAN CARLOS RODELO LÓPEZ VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. DARIO SAMUEL SARABIA CABALLERO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

TESTIGO SOCIAL AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY TESTIGO SOCIAL No. 004

POR LOS LICITANTES

EMPRESA REPRESENTANTE

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE. C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

EMILIO CONTRERAS MENDOZA. NO SE PRESENTÓ

IV – ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS:

Para la presentación y apertura de propuestas, siendo las 13:00 Hrs. del día 04 de octubre del 2022, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de éste municipio, integrantes del Comité de Obra y un representante de la empresa que participó en la licitación,

ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY, TESTIGO SOCIAL: No. DE REGISTRO: 004

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

para dar cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en donde estuvieron presentes para su realización:

POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRA:

Arq. Casandra Carolina Morales Lugo: Presidente suplente del Comité de Obra.

Dr. Arturo Retamosa López, Secretario Ejecutivo del Comité de Obras

Dr. Víctor Alfonso García Félix: Vocal del Comité.

Ing. Juan Carlos Rodelo López: Vocal del Comité.

Representante del Órgano Interno de Control.

Arq. Darío Samuel Sarabia Caballero:

COMO ASISTENTE TÉCNICO:

Ing. Daniel Medina Mendoza: Encargado de Licitaciones

COMO TESTIGO SOCIAL:

Ing. Carlos Enrique Acosta Ley

POR LAS EMPRESAS LICITANTES:

REPRESENTANTES:

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE ----- CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
EMILIO CONTRERAS MENDOZA ----- NO SE PRESENTÓ

Esta Sesión de Presentación y Apertura de Propuestas fue transmitido en tiempo real: Sitio web: YouTube – Canal: Obras Públicas del Municipio de Navolato – Link: https://www.youtube.com/channel/UCpgYkZ_jmZHvkvPlz9Qqzg

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS:

Esta sesión de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas fue presidida y dirigida por la Presidenta suplente del Comité de Obras; Arq. Casandra Carolina Morales Lugo, bajo el siguiente orden del día:

- 1 – Presentación de las personas que asistieron al evento
- 2 – Lista de asistencia de los licitantes participantes
- 3 – Recepción de los sobres cerrados que contienen las propuestas presentadas por los licitantes – propuesta técnica, propuesta económica y anexos.

**TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.**

4 – Apertura de los sobres y revisión cuantitativa de los documentos que lo integran anotándose en un registro el contenido de los mismos, sin entrar al análisis y valoración, y se registra el monto sin IVA de la propuesta económica del licitante.



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS - ECONÓMICAS

En la ciudad de Navolato, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 04 de Octubre del 2022, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, sita en Avenida Benito Juárez S/N en la Colonia Primavera II de la Ciudad de Navolato, Sinaloa, C.P. 80324, los siguientes funcionarios de la misma para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa: **ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO**, Presidenta Suplente del Comité de Obra Municipal y Jefa del Departamento de Evaluación Técnica, **DR. ARTURO RETAMOZA LÓPEZ**, Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Municipal y Tesorero Municipal, **DR. VICTOR ALFONSO GARCÍA FÉLIX** Vocal del Comité de Obra y Director de Asuntos Jurídicos, **ING. JUAN CARLOS RODELO LÓPEZ**, Vocal Suplente del Comité de Obra Municipal por el Órgano Interno de Control, **ARQ. DARIO SAMUEL SARABIA CABALLERO**, como representante del Órgano Interno de Control. Asistidos por el **C. ING. DANIEL MEDINA MENDOZA** Encargado de Licitaciones; con la finalidad de celebrar la apertura de las PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS del concurso por Licitación Pública N° AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, referente los trabajos de PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

Mismos trabajos que serán cubiertos con Recursos Económicos del FAISM del Ramo 33 (Recursos del ejercicio fiscal 2022). Los cuales serán liberados a través de la tesorería municipal del H. Ayuntamiento de Navolato.

En calidad de testigo social para participar en este procedimiento se designó al **ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY**, testigo social No. 004.

Concurso en el cual, se registraron los siguientes licitantes:

LICITANTES	REPRESENTANTES
1- CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.	C. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.
2- EMILIO CONTRERAS MENDOZA.	NO SE PRESENTÓ

Haciendo del conocimiento que con relación a la documentación distinta (documentos legales) solicitada por esta dependencia a los licitantes para participar en este concurso, documentos que son solicitados en las bases, mismos que se reciben en este acto, junto con su propuesta del concurso para su posterior revisión; dicha documentación es la siguiente:

1. DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el mismo, teléfono de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del



del H. Ayuntamiento de Navolato se reunirá en este mismo lugar del día JUEVES 13 de Octubre a partir de las 10:00 horas, para el análisis cualitativo de las propuestas de los licitantes.

B.- Se da lectura a la presente acta, haciéndose una cordial invitación a los presentes para que acudan a esta misma sala, el día martes 18 de Octubre del 2022, a las 14:00 horas, al acto en el cual se dará a conocer el resultado del análisis cualitativo de los documentos previos y de las propuestas técnicas y económicas de los participantes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, se cierra a las 13:40 horas del mismo día de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregársiles a los asistentes una copia de la misma.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL.

DR. ARTURO RETAMOZA LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL.

ING. JUAN CARLOS RODELO LÓPEZ
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

DR. VICTOR ALFONSO GARCÍA FÉLIX
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. DARIO SAMUEL SARABIA CABALLERO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

LICITANTES INSCRITOS:

- 1 – CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE
- 2 – EMILIO CONTRERAS MENDOZA

MONTO SIN IVA

\$ 2'369,813.37

NO SE PRESENTÓ

5 – Se rubrican el catálogo de conceptos y el programa de obra de la propuesta económica por uno de los licitantes seleccionado por ellos, y por el servidor público que preside el Comité,

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

posteriormente fueron regresados a sus sobres correspondientes, para ser depositados y bajo resguardo en lugar seguro dentro de las mismas instalaciones, para su futura evaluación.



APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS
LICIT. PUB. NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS - ECONÓMICAS

En la ciudad de Navolato, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 04 de Octubre del 2022, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, sita en Avenida Benito Juárez S/N en la Colonia Primavera II de la Ciudad de Navolato, Sinaloa, C.P. 80324, los siguientes funcionarios de la misma para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa: **ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO**, Presidenta Suplente del Comité de Obra Municipal y Jefa del Departamento de Evaluación Técnica, **DR. ARTURO RETAMCOZA LÓPEZ**, Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Municipal y Tesorero Municipal, **DR. VICTOR ALFONSO GARCÍA FÉLIX** Vocal del Comité de Obra y Director de Asuntos Jurídicos, **ING. JUAN CARLOS RODELO LÓPEZ**, Vocal Suplente del Comité de Obra Municipal por el Órgano Interno de Control, **ARQ. DARIO SAMUEL SARABIA CABALLERO**, como representante del Órgano Interno de Control, Asistidos por el **C. ING. DANIEL MEDINA MENDOZA** Encargado de Licitaciones, con la finalidad de celebrar la apertura de las PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS del concurso por Licitación Pública N° AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, referente los trabajos de PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HEROES ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

Mismos trabajos que serán cubiertos con Recursos Económicos del FAISM del Ramo 33 (Recursos del ejercicio fiscal 2022). Los cuales serán liberados a través de la tesorería municipal del H. Ayuntamiento de Navolato.

En calidad de testigo social para participar en este procedimiento se designó al **ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY**, testigo social No. 004.

Concurso en el cual, se registrarán los siguientes licitantes:

LICITANTES

- 1- CARLOS SANTIESTERAN ESCALANTE.
- 2- EMILIO CONTRERAS MENDOZA.

REPRESENTANTES

- 1- CARLOS SANTIESTERAN ESCALANTE
- 2- NO SE PRESENTÓ

Haciendo del conocimiento que con relación a la documentación distinta (documentos legales) solicitada por esta dependencia a los licitantes para participar en este concurso, documentos que son solicitados en las bases, mismos que se reciben en este acto, junto con su propuesta del concurso para su posterior revisión, dicha documentación es la siguiente:

1. DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el mismo, teléfono de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del



APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS
LICIT. PUB. NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022



del H. Ayuntamiento de Navolato se reunirá en este mismo lugar del día **JUEVES 13 de Octubre** a partir de las 10:00 horas, para el análisis cualitativo de las propuestas de los licitantes.

B.- Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudan a esta misma sala, el día **martes 18 de Octubre del 2022**, a las 14:00 horas, al acto en el cual se dará a conocer el resultado del análisis cualitativo de los documentos previos y de las propuestas técnicas y económicas de los participantes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, se cierra a las 13:40 horas del mismo día de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregarles a los asistentes una copia de la misma.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL

DR. ARTURO RETAMCOZA LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS RODELO LÓPEZ
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. VICTOR ALFONSO GARCÍA FÉLIX
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. DARIO SAMUEL SARABIA CABALLERO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

V- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El día 18 de octubre del 2022 a las 14:00 hrs. Se reúne de nuevo el Comité de Obras en las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Navolato para desarrollar la etapa de análisis CUALITATIVO Y EVALUATORIO de la propuesta que participa en este procedimiento de Licitación.

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

Esta sesión de evaluación fue transmitida en tiempo real a través de la plataforma Sitio web: YouTube – Canal: Obras Públicas del Municipio de Navolato – Link: https://www.youtube.com/channel/UCpgYkZ_jJmZHvbkPlz9Qqzg

En cumplimiento del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, las evaluaciones de las propuestas se realizan aplicando las modalidades y criterios siguientes:

- 1 – Método de Puntos y Porcentajes para la evaluación de la Propuesta Técnica
- 2 – Método de Tasación Aritmética para la evaluación de la propuesta Económica.

PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU ANALISIS CUALITATIVO CON SUS RESPECTIVOS MONTOS:

LICITANTE	MONTO CON IVA
1 – CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	----- \$ 2´679,383.51

En la revisión y análisis detallado de los documentos adicionales y la propuesta técnica se dictaminó desechar la propuesta presentada por la empresa:

NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS

PROPUESTA SOLVENTE PARA SU EVALUACION TÉCNICA:
CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE.

La evaluación consideró los siguientes puntos por rubro; en la aplicación del método de Puntos y Porcentajes:

- Calidad de la obra ----- 16 puntos
- Capacidad del licitante ----- 12 puntos
- Experiencia y especialidad del licitante ----- 14 puntos
- Cumplimiento de contratos ----- 5 puntos
- Contenido Nacional ----- 3 puntos
- S U M A : ----- 50 PUNTOS**

TABLA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, POR EL MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES:

**TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.**

Como resultado del análisis de las propuestas técnicas, se obtuvo lo siguiente:

VALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES		CALIDAD DE LA OBRA 16 PUNTOS					CAPACIDAD DEL LICITANTE 12 PUNTOS				EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 14 PUNTOS		CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 5 PUNTOS	CONTENIDO NACIONAL 3 PUNTOS		PUNTUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 50 PUNTOS	
No.	LICITANTE	2 Punto MATERIALES	3 Punto MANO DE OBRA	3 Punto MAQ Y EQUIPO	2 Punto PROF. TÉCNICOS	3 Punto PROC. COSNT	3 Punto PROGRAMAS	5 Punto RECURSOS HUMANOS	5 Pto REC. ECONÓMICO	1 Punto DISCAPACITADOS	1 Punto MYPPMES	Experiencia = (7.00 Puntos)	Especialidad = (7.00 Puntos)	Cumplim Contratos (5 Puntos)	Mat. Maq. Ea. De Inst. Perm. = (1.50 Punto)	Meno de Obra = (1.50 Punto)	TOTAL
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	2	3	3	2	3	3	5	5	0	0	7.00	7.00	5.00	1.50	1.50	48.00
2												6.60 meses	4 contratos	4 actas			
3																	

Una vez obtenido las propuestas SOLVENTES en su aspecto técnico, se realiza el análisis cualitativo de la propuesta económica y se enlistaran a los licitantes con sus respectivos montos

Para lo anterior, primeramente se dio a conocer el presupuesto base de la obra determinado por la convocante Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Navolato, y se determinó en las bases de licitación como rango de aceptación para las propuestas económicas lo siguiente. no deba ser mayor al presupuesto base ni menor al 90% de dicho presupuesto.

Presupuesto Base:	\$	2,714,320.06	CON I.V.A.
90% Presupuesto Base:	\$	2,442,888.05	CON I.V.A.
Rango:	\$	2,714,320.06 al \$	2,442,888.05 CON I.V.A.

Se anotan las propuestas con sus importes para analizar si están dentro del rango de aceptación, en el mismo orden que se hizo el análisis técnico.

No.	LICITANTE	IMPORTE CON I.V.A.	RESULTADO
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ 2,679,383.51	SOLVENTE
2			
3			

NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS

Se anotan las propuestas que quedaron dentro del rango de aceptación, en el mismo orden que se hizo el análisis técnico.

No.	LICITANTE	IMPORTE CON I.V.A.
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ 2,679,383.51
2		
3		

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

TASACIÓN ARITMETICA

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	UTILIDAD
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA		
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ 1,125,837.88	\$ 375,380.44	\$ 307,301.21	\$ 253,192.73	\$ 245,629.86
2						
COSTO DE MERCADO =		\$ 1,125,837.88	\$ 375,380.44	\$ 307,301.21	\$ 253,192.73	

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO DE INSUFICIENCIAS				SUMA	DIFERENCIA	RESULTADO
		Materiales (A)	Mano de Obra (B)	Maquinaria (C)	Costo Indirecto (D)	E=A+B+C+D	UTILIDAD - "E"	
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245,629.86	SOLVENTE
2								

Una vez calificada la solvencia por el método de Tasación Aritmética de las propuestas económicas, los licitantes cuyas propuestas que fueron DESECHADAS por resultar INSOLVENTES, fueron las siguientes:

NO HUBO PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez realizado la Tasación Aritmética de las propuestas económicas, los licitantes cuyas propuestas resultaron "SOLVENTES" en la evaluación, fueron las siguientes, :

No.	LICITANTE	IMPORTE CON I.V.A.	RESULTADO
1	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE	\$ 2,679,383.51	SOLVENTE
2			

Por las razones y motivos expuestos en el presente instrumento, y con el fin principal de elegir a favor del H. Ayuntamiento de Navolato las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y tiempo, por decisión unánime de sus miembros. El Comité procede a dictaminar, y

----- D I C T A M I N A -----

PRIMERA. Que la mejor propuesta fue la presentada por el licitante

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

con un importe sin incluir el I.V.A., por: \$ 2,309,813.37

SON: (DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 37/100 M.N.)

con un importe con I.V.A. incluido, por: \$ 2,679,383.51

SON: (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.)

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.



ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA
MUNICIPAL Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION
TÉCNICA



DR. ARTURO RETAMOZA LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL.



LIC. MARCOS VINICIO VERÁSTICA CASILLAS
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



DR. VÍCTOR ALFONSO GARCÍA FÉLIX
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ARQ. DARIÓ SAMUEL SARABIA CABALLERO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO AL PROCEDIMIENTO



ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY
TESTIGO SOCIAL No. 004 DESIGNADO AL PROCEDIMIENTO.

VI – FALLO:

EL COMITÉ DE OBRA, UNA VEZ ANALIZADOS Y VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE NOS OCUPA, EMITE EL PRESENTE FALLO:

QUE LA MEJOR PROPUESTA FUE LA PRESENTADA POR EL LICITANTE:
CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

Con un importe con IVA incluido, por: \$ 2'679,383.51

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.



ACTA DE FALLO
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022

En la Ciudad de Navolato, Sinaloa, a las 10:00 horas del día 18 de Octubre del 2022, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Navolato, sito en Av. Benito Juárez S/N de la colonia Primavera 2, de la ciudad de Navolato, Sinaloa, código postal 80320, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: **ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO**, Presidenta suplente del Comité de Obra Municipal y Jefe del Departamento de Evaluación Técnica; **DR. ARTURO RETAMOZA LÓPEZ**, Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Municipal y Tesorero Municipal; **LIC. MARCOS VINICIO VERÁSTICA CASILLAS**, Vocal del Comité de Obra Municipal del Órgano Interno de Control; **DR. VÍCTOR ALFONSO GARCÍA FÉLIX**, Vocal del Comité de Obra Municipal de la Dirección de Asuntos Jurídicos; **Arq. Darío Samuel Sarabia Caballero**, Representante del Órgano Interno de Control. Con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del Concurso No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, referente a la Licitación Pública Nacional No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

En calidad de Testigo Social para participar en este procedimiento se designó al **ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY**, Testigo Social No. 004.

La **ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO**, Presidenta Suplente del Comité de Obra Municipal y Jefe del Departamento de Evaluación Técnica, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al Dictamen emitido por el comité de Obras Municipales del H. Ayuntamiento de Navolato, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión Extraordinaria No. 18, de fecha 18 de Octubre del 2022, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que la licitante **CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE**, resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgará al licitante que cumplió con todo lo solicitado y que presentará la propuesta económica más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los licitantes, determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de Obras del H. Ayuntamiento de Navolato; por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudicó a la licitante **CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE**, representada por el **C. ARQ. CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE**, por haber presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de \$ 2'879,388.51 (Son: Dos Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Tricientos Ocho y Tres pesos 51/100 m.n.) con el impuesto al valor agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Tomando en cuenta lo anterior, se le informó al representante legal de la licitante ganadora antes mencionado que la firma del contrato se realizará a las 11:00 hrs. en la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Navolato, el día 19 de Octubre del 2022; Así mismo, se le informó que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el día 21 de Octubre del 2022, en la misma Dirección. Comenzándose que el anticipo les será pagado en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicadas en av. Antón Rosales no. 49 int. Col. Centro, de la Ciudad de Navolato, Sinaloa, c.p. 80320, teléfono (672) 727-09-33 ext. 1340, a través de transferencia electrónica de fondos. Siendo la fecha de inicio de los trabajos el día 24 de Octubre del 2022 y fecha de término el día 05 de Diciembre del 2022, con una duración de 45 días calendario.

Página 1 de 3



ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leído que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 14:50 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y alanco para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes que la solicitaron y de lo cual se deja constancia.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ARQ. CASANDRA CAROLINA MORALES LUGO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DR. ARTURO RETAMOZA LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCOS VINICIO VERÁSTICA CASILLAS
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. VÍCTOR ALFONSO GARCÍA FÉLIX
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. DARIÓ SAMUEL SARBIA CABALLERO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TESTIGO SOCIAL

ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY
TESTIGO SOCIAL No. 004 ASIGNADO A LA LICITACIÓN

CONCLUSIONES:

DOY TESTIMONIO QUE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008-2022, REALIZADA POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, Y QUE TIENE POR OBJETO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, se realizó con apego a las disposiciones legales en la materia y que, durante el proceso, este se desarrolló de manera puntual y transparente por parte de todas las personas que en ella intervinieron.

RECOMENDACIONES:

- 1 – Con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo IV - De La Presupuestación de la Obra Pública – Artículo 27 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Se recomienda: La presencia de al menos un testigo social durante la elaboración del presupuesto de la obra motivo del contrato, esto es, para vigilar la correcta aplicación de los

ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY, TESTIGO SOCIAL: No. DE REGISTRO: 004

TESTIMONIO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AYTONAV-LP-FAISM-PAV30PNHEROES-COLANG-NAV-008/2022, EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES ENTRE AVE. 16 DE SEPT Y AV. AGUSTIN MELGAR EN LA COL. LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA.

parámetros que en el intervienen: los indicadores de costos vigentes, los tabuladores de precios unitarios vigentes, y los aranceles de servicios profesionales o precios de obras similares vigentes, así como del servicio público de transporte de carga y considerar los costos derivados de la forma de pago.

2 – Con fundamento en lo establecido en el artículo 40 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

Fracción IX - Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes:

- a. Proponer a las instituciones, mejoras para fortalecer la transparencia e imparcialidad en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
- b. Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de su participación en los procedimientos de licitación para el establecimiento de acciones en la contratación, así como de las obras por administración directa;

Se recomienda que: Se establezca la participación del testigo social a partir de la revisión del proyecto de convocatoria y de las bases de la licitación para efectos de revisar su contenido, antes de ser publicadas.

ATENTAMENTE:



ING. CARLOS ENRIQUE ACOSTA LEY
TESTIGO SOCIAL - - No. de registro - - 004
